



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA-AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
CONSISTENTE: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
ENTRE: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO
ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
IMPORTE DEL CONTRATO \$923,843.06
PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
NO. DE ESTIMACION 02F (DOS FINIQUITO)

IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	MONTO TOTAL
\$	796,416.43	\$	127,426.63
			\$ 923,843.06

ANTICIPO DE OBRA	IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	MONTO TOTAL
\$	238,924.93	\$	38,227.99
			\$ 277,152.92

1. ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

CONTRATO NO.	ESTIMACION	PERIODO DE ESTIMACION	ESTIMACIONES			AMORTIZACION DE ANTICIPO			DEDUCCIONES				IMPORTE DE COBRO	
			IMPORTE SIN I.V.A.	I.V.A.	TOTAL	PORCENTAJE AMORTIZADO	AMORTIZACION DEL ANTICIPO SIN I.V.A.	I.V.A. DE AMORTIZACION	TOTAL DE AMORTIZACION	5.51 AL MILLAR	5.00 AL MILLAR	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011	1 (UNO)	DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 376,584.65	\$ 60,250.35	\$ 436,835.00	100.00%	\$ 238,924.93	\$ 38,227.99	\$ 277,152.92	\$ -	\$ 1,882.82	\$ -	\$ 1,882.82	\$ 157,779.28
PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011	02F (DOS FINIQUITO)	DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$ 419,851.78	\$ 67,176.28	\$ 487,028.06	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,313.38	\$ -	\$ -	\$ 2,313.38	\$ 484,714.68
TOTAL			\$	\$	\$ 923,843.06				\$ 277,152.92	\$ 2,313.38	\$ 1,882.82	\$ -	\$ 4,196.20	\$ 642,493.94

MONTO CONTRATADO:	\$	923,843.06	AVANCE FINANCIERO	100.00%	ANTICIPO DE OBRA	\$	277,152.92
ESTIMACION ACUMULADA POR ESTIMAR	\$	923,843.06			AMORTIZACION ACUMULADA POR AMORTIZAR	\$	277,152.92
SUMAS IGUALES	\$	923,843.06			SUMAS IGUALES	\$	277,152.92



OBRA PUBLICAS
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GDO. TLAX. 2024-2027

REALIZÓ
ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:
ING ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR DE OBRA
HOJA 1 DE 1

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

[illegible]

CONTRATO:	CONTRATO:	CONTRATO:	\$523,843.06
IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	
PROGRAMA:	PROGRAMA:	PROGRAMA:	
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONT	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONT	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONT	
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	
NO. DE ESTIMACIÓN	NO. DE ESTIMACIÓN	NO. DE ESTIMACIÓN	
NO. DE ESTIMACIÓN	NO. DE ESTIMACIÓN	NO. DE ESTIMACIÓN	

DOMINGUEZ AMARAC DE GUERRERO, TLAXCALA														
CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.O.E M.	CANTIDAD	P.V.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		ESTIMACIÓN 2 (DOS)		ACUMULADO IMPORTE	EXCEDENTE	FALTANTE		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE					
PRIVADA XICHO TENCALL														
1	PRELIMINARES													
TNL-003	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	M2	84.46	\$ 13.06	\$ 1,103.31	75.94	\$ 991.78	0.00	\$ -	75.94	\$ 991.78	0.00	\$ 8.54	\$ 111.53
0	RETIRO DE ACQUIN EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: ACERQUE EN CAMION PARA SU POSTERIOR COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO	M2	15.17	\$ 49.24	\$ 746.87	17.22	\$ 847.91	0.00	\$ -	17.22	\$ 847.91	2.05	\$ 100.94	\$ -
TRR-005	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CERPAS MATERIAL BEGO TIPO "B" CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.5 MTS, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	125.50	\$ 135.76	\$ 17,037.88	126.50	\$ 17,173.84	0.00	\$ -	126.50	\$ 17,173.84	1.00	\$ 135.78	\$ -
CA-001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO Y CARGA MECANICA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE CORTES Y DEMOLICIONES, VOLUMEN MEDIDA.	M3	29.62	\$ 85.59	\$ 2,535.18	50.48	\$ 4,321.44	0.00	\$ -	50.48	\$ 4,321.44	20.87	\$ 1,768.28	\$ -
CA-002	ACARREO EN CAMION, A KILOMETROS SUBSECUENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M3/KM	88.86	\$ 12.79	\$ 1,136.52	151.47	\$ 1,937.30	0.00	\$ -	151.47	\$ 1,937.30	138.68	\$ 1,773.72	\$ -
2	ALCANTARILLADO													
ALB-003	COMPACTACION DE LA SUBRASANTE EN CERPAS PARA RECIBIR CAMA DE ARENA Y TUBERIA, POR MEDIOS MECANICOS, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM, INCORPORACION DE AGUA PARA SU COMPACTACION, INCLUYE: PRUEBAS DE COMPACTACION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	84.46	\$ 28.76	\$ 2,431.33	42.50	\$ 1,223.15	0.00	\$ -	42.50	\$ 1,223.15	0.00	\$ 41.98	\$ 1,208.18
ALB-005	CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, PARA RECIBIR TUBERIA DE PEAD CORRUGADO, INCLUYE: ACARQUES A PRIMERA ESTACION 20 MTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	70.78	\$ 41.80	\$ 2,944.86	42.50	\$ 1,768.00	0.00	\$ -	42.50	\$ 1,768.00	0.00	\$ 28.28	\$ 1,178.86
ALB-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUJO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ELABORAR UN FLEJE PARA LA PROTECCION DE LA TUBERIA HERMETICA, AFINE DE CERPAS, ACOSTADO DE LOS REJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	88.48	\$ 582.25	\$ 48,747.88	83,180.16	\$ 48,756.81	5,319.82	\$ -	88.48	\$ 48,747.88	0.00	\$ 0.00	\$ -
ALB-012	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN FORMA CONICA DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 8X12X24 CM DE ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, PLANADO PULIDO EN SU INTERIOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, ESCALERA MARINA CON VARILLA DE NO.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00	\$ 8,335.81	\$ 25,343.84	0.00	\$ -	4.00	\$ 25,343.84	4.00	\$ 25,343.84	0.00	\$ 0.00	\$ -
ALB-013	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE VISITA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 3,514.40	\$ 14,057.60	0.00	\$ -	4.00	\$ 14,057.60	4.00	\$ 14,057.60	0.00	\$ 0.00	\$ -

GRUPOS PÚBLICOS

EL AVANCE DEL MOVIMIENTO CONSTITUCIONAL
EN EL PERU DE 1978 A 2022

LABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA.
SUPERVISOR
HOJA 1 DE 4

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA-AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
EN: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PIED, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO
ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: IMPORTE DEL CONTRATO: \$923,843.06
PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER) 2024
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
NO. DE ESTIMACION: 07F (DOS FINQUITO)

CLAVE	CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	ESTIMACION 1 (UNO)	ESTIMACION 2 (DOS)	ACUMULADO	EXCEDENTE	FALTANTE
			CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
REP-001	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE POLIDUCTO NEGRO DE 1/2", ANCHO DE 1.5 CM, INCLUYE: EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	9.00 \$ 376.83 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9.00 \$ 3,391.47 \$
ALC-008	DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 6 METROS, INCLUYE: EXCAVACION HASTA 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, AFINE, TUBERIA PVC SANITARIO DE 4", CODO DE PVC SANITARIO 45° DE 4", CONEXION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA POR MEDIOS MECANICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	13.00 \$ 852.34 \$	0.00 \$	14.00 \$ 11,832.78 \$	14.00 \$ 11,932.78 \$	1.00 \$ 852.34 \$	0.00 \$
TRR-015	RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V. EN CAPAS DE 20 CM PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	88.45 \$ 79.61 \$	0.00 \$	87.51 \$ 5,374.47 \$	87.51 \$ 5,374.47 \$	0.00 \$	18.94 \$ 1,507.61 \$
PAV-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANGU TRITURADO DE 3/4" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V. (NO TEZONTE) COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1800 KG/M3, INCORPORACION DE AGUA PARA SU COMPACTACION Y PRUEBAS DE COMPACTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	11.75 \$ 108.33 \$	0.00 \$	13.80 \$ 1,508.75 \$	13.80 \$ 1,508.75 \$	2.05 \$ 224.13 \$	0.00 \$
ADO-003	PAVIMENTO DE ADOSADO RECUPERADO, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACION DE ARENA CRIBADA PARA EL RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ADOSADOS, BARRIDO DE LOS EXCEDENTES DE ARENA, MANOBRAS LOCALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	15.17 \$ 110.64 \$	0.00 \$	16.67 \$ 1,844.37 \$	16.67 \$ 1,844.37 \$	1.50 \$ 165.96 \$	0.00 \$
SUBTOTAL		\$ 75,020.03 \$	\$ 83,052.66 \$	\$ 138,072.69 \$	\$ 138,072.69 \$	\$ 5,039.11 \$	\$ 7,385.85 \$
IVA		\$ 12,003.20 \$	\$ 10,088.43 \$	\$ 22,091.63 \$	\$ 22,091.63 \$	\$ 606.26 \$	\$ 1,183.35 \$
PRIVADA XICOTENCATL		\$ 87,023.23 \$	\$ 73,141.09 \$	\$ 160,184.32 \$	\$ 160,184.32 \$	\$ 5,645.37 \$	\$ 8,569.20 \$
CALLE XICOTENCATL							
1	PRELIMINARES						
TN-003	TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	291.26 \$ 13.06 \$	293.56 \$ 3,833.69 \$	0.00 \$	293.56 \$ 3,833.69 \$	2.27 \$ 28.65 \$	0.00 \$
TN-005	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 A 15 CM, INCL. PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIPO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	575.80 \$ 30.43 \$	307.42 \$ 8,354.79 \$	0.00 \$	307.42 \$ 8,354.79 \$	0.00 \$	288.48 \$ 8,169.85 \$
TN-007	DEMOLICION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 A 15 CM POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREO PARA SU POSTERIOR RETIRO.	281.26 \$ 44.15 \$	293.56 \$ 12,860.45 \$	0.00 \$	293.56 \$ 12,860.45 \$	2.27 \$ 100.22 \$	0.00 \$
TRR-005	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO "B" CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 3.5 MTS, INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	407.80 \$ 135.78 \$	410.98 \$ 55,784.64 \$	0.00 \$	410.98 \$ 55,784.64 \$	3.18 \$ 431.72 \$	0.00 \$
CA-001	ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO Y CARGA MECANICA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE CORTES Y DEMOLICIONES, VOLUMEN MEDIDA.	171.93 \$ 85.59 \$	162.32 \$ 14,715.49 \$	0.00 \$	162.32 \$ 13,862.97 \$	0.00 \$	822.52 \$
CA-002	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	515.80 \$ 12.79 \$	486.96 \$ 6,228.22 \$	0.00 \$	486.96 \$ 6,228.22 \$	0.00 \$	368.86 \$
2		AL CANTABILADO					

OBRAS PÚBLICAS

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 2 DE 4

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY670812278
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICONTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC
CONSUENTE: DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO: DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
ENTRE: PRIMERA SECCION AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODER24-001/PIE2401-010, PRODER24-001/PIE2401-011
IMPORTE DEL CONTRATO: \$923,843.08
PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
NO. DE ESTIMACION: 02F (DOS FINQUITO)

DOMINGUEZ AMOAC DE GUERRERO, TLAXCALA															
CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.D.E.M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	2. CUERPO DE ESTIMACION				ACUMULADO		EXCEDENTE	FALTANTE		
						CANTIDAD	ESTIMACION 1 (UNO)	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE					
PAV-001	PAVIMENTO BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. (NO TEZONTLE) COMPRENDIENDO ENTRE 1700 A 1900 KG/M3, INCORPORACION DE AGUA PARA SU COMPACTACION Y PRUEBAS DE COMPACTACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	M2	270.75	\$ 109.33	\$ 29,801.10			\$ 0.00	\$ 31,734.13	280.26	\$ 31,734.13	19.51	\$ 2,133.03	0.00	\$ -
PAV-005	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE MR 30 PREMEZCLADO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABO PULIDO O ESCOBILLADO, JUNTAS FRIAS CON DISCOS DE CORTE A CADA 3 METROS, RAYADO CON VOLTADOR EN LAS ARISTAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 6-6, INCLUYE:MATERIALES,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	270.75	\$ 524.24	\$ 141,937.88			\$ 0.00	\$ 152,165.90	280.26	\$ 152,165.90	19.51	\$ 10,227.82	0.00	\$ -
	EXTRAORDINARIOS DEMOLICION, EXCAVACION HASTA 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION, AFINE, TUBERIA PEAD SANITARIO DE 8", BOTA DE INSECCION PARA TUBO PEAD DE 8", CONEXION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CEPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	0.00	\$ 185.68	\$ -	167.070102		\$ 0.00	\$ 31,018.24	167.070102	\$ 31,018.24	167.070102	\$ 31,018.24	0.00	\$ -
SUBTOTAL					\$ 301,544.82			\$ 356,788.12		\$ 658,343.74		\$ 48,917.99		\$ 46,588.29	
IVA					\$ 48,247.15			\$ 57,087.86		\$ 105,335.01		\$ 7,868.88		\$ 7,454.13	
CALLE XICONTENCATL TOTAL					\$ 349,791.77			\$ 413,896.08		\$ 763,678.76		\$ 57,004.87		\$ 54,042.42	
SUBTOTAL					\$ 786,416.43			\$ 419,851.78		\$ 786,416.43		\$ 54,857.10		\$ 63,884.14	
I.V.A. 16%					\$ 127,428.63			\$ 67,178.28		\$ 6,793.14		\$ 8,937.46		\$ 8,937.46	
TOTAL					\$ 923,843.06			\$ 487,028.06		\$ 923,843.06		\$ 63,780.24		\$ 92,821.60	



OPRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAYORAL DE GO. TLAX. 2024-2027

REVISOR:
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 4 DE 4

ELABORÓ
ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZO
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ARQ. YESENIA MENESES LIMA

MELY8708122T8

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

ml_yesenia@hotmail.com

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA-AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATADO
PROGRAMA:

\$923,843.06

PROGRAMA:	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
	DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	
	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
	NO. DE ESTIMACIÓN	2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES

CLAVE:	ALB-006	CONCEPTO:	GENERADOR							OBSERVACIONES
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUYE: JUNTA HERMÉTICA, AFINE DE CEPAS, ACOSTILLADO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.								
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL		
1.00	1	1.00	16.28				M	16.28		
	2	1.00	35.35				M	35.35		
	3	1.00	36.85				M	36.85		
								TOTAL	88.48	

COBRADO EN ESTIMACION 1

83.16018 CANTIDAD AUTORIZADA EN EST. 1

ESTA ESTIMACION

5.31982



OBRAS PÚBLICAS

**M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ANAAE DE GRO., JAN. 2024-2027**

REVISO:

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATO \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN 2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES									
CLAVE:	ALB-012	CONCEPTO:	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA EN FORMA CÓNICA DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X12X24 CM DE ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, ESCALERA MARINA CON VARILLA DE NO.4, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
GENERADOR									
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
	0+00		1.00				PZ	1.00	
	0+017.80		1.00				PZ	1.00	
	0+054.30		1.00				PZ	1.00	
	0+092.30		1.00				PZ	1.00	
TOTAL							PZ	4.00	



ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

REVISÓ:

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

OBRA PÚBLICAS
D. AVIATAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRD. TLAX. 2024-2027



ARQ. YESENIA MENESES LIMA

MELY8708122T8

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

ml_yesenia@hotmail.com

OBRA:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN:

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO:

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD:

PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE:

ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:

PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO

\$923,843.06

PROGRAMA:

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN

2F (DOS FINQUITO)

3. GENERADORES

CLAVE:

ALB-013

CONCEPTO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE VISITA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

GENERADOR							OBSERVACIONES
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	
0+00	POZO 1	1.00				PZ	
0+017.80	POZO 2	1.00				PZ	
0+054.30	POZO 3	1.00				PZ	
0+092.30	POZO 4	1.00				PZ	
TOTAL						PZ	4.00



OBRAS PÚBLICAS

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE CHO., TLAN. 2024-2027

REVISÓ:

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATO: \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACION: 2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES									
CLAVE:	ALC-008	CONCEPTO:	DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 6 METROS, INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, AFINE, TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4", CODO DE PVC SANITARIO 45° DE 4", CONEXIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CEPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.						
GENERADOR									
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
1.00	2.00	2.00					PZ	2.00	
	2.00	6.00					PZ	5.00	
	3.00	7.00					PZ	7.00	



OBRA PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR N° 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

mi_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN 2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES

RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

GENERADOR									OBSERVACIONES	
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	ALTURA PROMEDIO	UNIDAD		TOTAL
	1		16.95	0.80	2.00	1.70	1.85	M3	25.09	
	2		35.65	0.80	1.70	1.40	1.55	M3	44.21	
	3		36.85	0.80	1.40	1.20	1.30	M3	38.32	
							EXCAVACION TOTAL		107.62	
MENOS CAMA DE ARENA	1		89.75	0.80			-0.10	M3	-7.18	
MENOS TUBERIA	1		88.78				-0.10	M3	-8.88	
POZOS	POZO	3.00	1.85	1.85			-1.50	M3	-15.40	
	POZO	1.00	1.85	1.85			-1.42	M3	-4.86	
BASE			16.95	0.80			-0.20		-2.71	
ADOQUIN			16.95	0.80			-0.08		-1.08	
TOTAL									M3	67.51

VOLUMEN DE TUBERIA DE 12" = $\pi (0.18)^2 = 0.10$



OBRA PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ:

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ARQ. YESENIA MENESES LIMA

MELY8708122T8

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

ml_yesenia@hotmail.com

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE
GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:

PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO

\$923,843.06

PROGRAMA:

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN D
PERIODO DE ESTIMACIÓN:

DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.M. (NO TEZONTLE) COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1900 KG/M3, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.

GENERADOR								OBSERVACIONES
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	
	1.00	1	1.00	17.25	0.80		M2	13.80
</								

ELABORÓ

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

AUTORIZÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

**ONAS PÚBLICAS**

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MAYORES DE CNO., TIAN. 2024-2027



ARQ. YESENIA MENESES LIMA

MELY8708122T8

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

ml_yesenia@hotmail.com

OBRA:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN:

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO:

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD:

PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE:

ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:

PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO

\$923,843.06

PROGRAMA:

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN

2F (DOS FINQUITO)

3. GENERADORES

PAVIMENTO DE ADOPRETO RECUPERADO, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE ARENA CRIBADA PARA EL RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ADOPRETO, BARRIDO DE LOS EXCEDENTES DE ARENA, MANIOBRAS LOCALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.

GENERADOR							OBSERVACIONES	
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL
1.00	1	1.00	17.25	0.80			M2	13.80
		1.00	1.85	1.85			M2	3.42
MENOS BROCAL		1.00		-0.55			M2	-0.55
TOTAL							M2	16.67

AREA DE BROCAL = $\pi \cdot (0.42)^2 = 0.55 \text{ M}^2$

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

ELABORÓ


ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

OBRA PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GNO., TLAX. 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

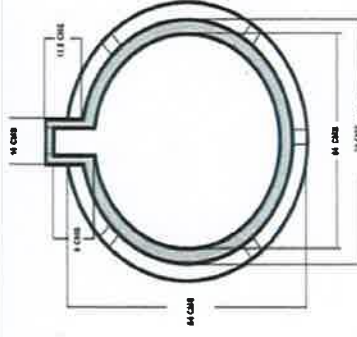



ARQ. YESENIA MENESES LIMA

MELY8708122T8

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

ml_yesenia@hotmail.com

OBRA:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN:

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO:

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD:

PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE:

ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:

PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO

\$923,843.06

PROGRAMA:

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN

2F (DOS FINIQUITO)

CLAVE:		ALB-008	CONCEPTO:	3. GENERADORES	
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 15" DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUYE: JUNTA HERMÉTICA, AFINE DE CEPAS, ACOSTILLADO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

GENERADOR						OBSERVACIONES
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	
00+00.00 AL 0+069.70	1 AL 2	1.00	68.10	1.00		
0+069.70 AL 0+147.40	2 AL 3	1.00	75.97	1.00		
0+147.40 AL 0+191.10	3 AL 4	1.00	41.35	1.00		
0+191.10 AL 0+241.10	4 AL 5	1.00	48.65	1.00		
0+241.10 AL 0+283.00	5 AL 6	1.00	38.95	1.00		
					SUBTOTAL	

ESTIMACION TOTAL	273.02
COBRADO EN ESTIMACION 1	219.84821
POR COBRAR ESTA ESTIMACION	53.17179
CANTIDAD AUTORIZADA EN EST. 1	



AMAXAC

OBAS PÚBLICAS
A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GNO., TLAN. 2024-2027

ELABORÓ

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

AUTORIZÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

CONSISTENTE EN:

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO:

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD:

PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE:

ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATO

PROGRAMA:

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

NO. DE ESTIMACIÓN

PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
\$923,843.06
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES

CLAVE:

ALB-012

CONCEPTO:

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA EN FORMA CÓNICA DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X12X24 CM DE ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, ESCALERA MARINA CON VARILLA DE NO.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GENERADOR							OBSERVACIONES	
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL
00+00.00	POZO 1	1.00					PZ	1.00
00+00.00 AL 0+068.70	POZO 2	1.00					PZ	1.00
0+068.70 AL 0+147.40	POZO 3	1.00					PZ	1.00
0+147.40 AL 0+191.10	POZO 4	1.00					PZ	1.00
0+191.10 AL 0+241.10	POZO 5	1.00					PZ	1.00
0+241.10 AL 0+283.00	POZO 6	1.00					PZ	1.00
TOTAL							PZ	6.00

REVISÓ:

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA PÚBLICAS

D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE ENS., TLAX. 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
mi_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN 2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES

3. GENERADORES									
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE VISITA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.									
CLAVE:	ALB-013			CONCEPTO:					
GENERADOR									
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES

00+00.00	POZO 1	1.00					PZ	1.00							
00+00.00 AL 0+068.70	POZO 2	1.00					PZ	1.00							
0+068.70 AL 0+147.40	POZO 3	1.00					PZ	1.00							
0+147.40 AL 0+191.10	POZO 4	1.00					PZ	1.00							
0+191.10 AL 0+241.10	POZO 5	1.00					PZ	1.00							
0+241.10 AL 0+283.00	POZO 6	1.00					PZ	1.00							
TOTAL							PZ	6.00							



OBRA PÚBLICAS

AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRD. TLAX. 2024-2027

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

ELABORÓ

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. YESENIA MENESES LIMA

MELY8708122T8

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

ml_yesenia@hotmail.com

OBRA:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN:

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO:

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD:

PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE:

ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:

PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO

\$923,843.06

PROGRAMA:

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN

2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES

REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE POLIDUCTO NEGRO DE 1/2", ABRAZADERAS DE 1/2", INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, COLOCACIÓN DE TOMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

GENERADOR							TOTAL		OBSERVACIONES
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	ALTURA PROMEDIO	UNIDAD	
00+00.00 AL 0+069.70	1 AL 2	7.00					TOMA	7.00	
0+069.70 AL 0+147.40	2 AL 3	17.00					TOMA	17.00	
0+147.40 AL 0+191.10	3 AL 4	11.00					TOMA	11.00	
0+191.10 AL 0+241.10	4 AL 5	9.00					TOMA	9.00	
0+241.10 AL 0+283.00	5 AL 6	4.00					TOMA	4.00	

	TOMA	48.00
--	------	-------



OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE CHO., TLAN. 2024-2027

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICHOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

MUNICIPIO: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

LOCALIDAD: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN 2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES

RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS EN CEPAS, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

GENERADOR							OBSERVACIONES	
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL
00+00.00 AL 0+069.70	1 AL 2		68.10	1.00	1.40		M3	95.34
0+069.70 AL 0+147.40	2 AL 3		75.97	1.00	1.40		M3	106.36
0+147.40 AL 0+191.10	3 AL 4		41.35	1.00	1.40		M3	57.89
0+191.10 AL 0+241.10	4 AL 5		48.65	1.00	1.40		M3	68.11
0+241.10 AL 0+283.00	5 AL 6		38.95	1.00	1.40		M3	54.53
	POZOS	6.00	1.85	1.85	1.40		M3	28.75
	MENOS POZO	6.00	1.85	-0.30	4.00	1.40	M3	-18.65
	MENOS TUBO		273.02	-0.16			M3	-43.68
	MENOS CAMA DE ARENA		273.02	1.00		-0.10	M3	-27.30
	MENOS BASE HIDRAULICA		273.02	1.00		-0.20	M3	-54.60
TOTAL							M2	266.75

VOLUMEN DE TUBERIA DE 15" = $\pi (0.223)^2 = 0.16$ M2


AREA DE BROCAL $=\pi(1.42)^2 = 0.55$ M2

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

AUTORIZÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

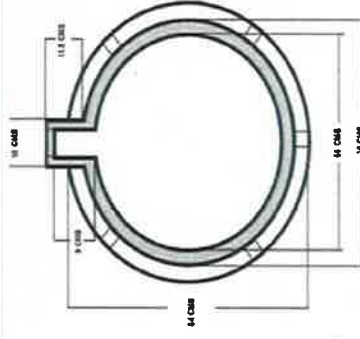

OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAX. 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ARQ. YESENIA MENESES LIMA

MELY8708122T8

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

ml_yesenia@hotmail.com

PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

OBRA:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

INVENTARIO:
LOCALIDAD:
PRIMERA SECCION. AMAXAC DE GUERRERO
ANUARIO DE GOBIERNO, TEXACA:

ENTRE:
ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE
GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATADO
PROGRAMA:

\$923,843.06
PROGRAMA


PROGRAMA:	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NO. DE ESTIMACIÓN	2F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES

BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. (NO TEZONTLE) COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1800 KG/M3. INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.Q.T.

EJE		GENERADOR					UNIDAD	SUBTOTAL
TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2			
00+00.00 AL 0+089.70	1 AL 2	1.00	68.10	1.00		M2	68.10	
0+089.70 AL 0+147.40	2 AL 3	1.00	75.97	1.00		M2	75.97	
0+147.40 AL 0+191.10	3 AL 4	1.00	41.35	1.00		M2	41.35	
0+191.10 AL 0+241.10	4 AL 5	1.00	48.65	1.00		M2	48.65	
0+241.10 AL 0+283.00	5 AL 6	1.00	38.95	1.00		M2	38.95	
MENOS BROCAL		6.00	1.85	1.85		M2	20.54	
			-0.55			M2	-3.30	
						TOTAL	290.26	

OBSERVACIONES

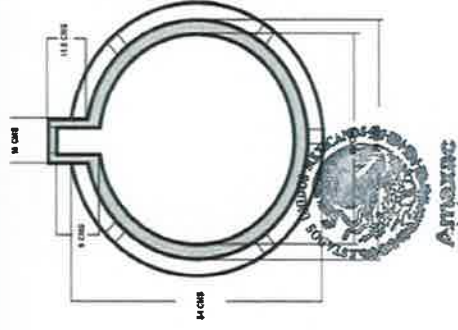

AREA DE BROCAL = $\pi(.42)^2 = 0.55 \text{ M}^2$

OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ANALAC DE GRO. TLAX. 2024-2027

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

 AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

ARQ. YESENIA MENESES LIMA

MELY8708122T8

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

ml vesenia@hotmail.com

PRODDER24-001/PIE2401-010. PRODDER24-001/PIE2401-011

OBRA:

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

DEMOLICIONES EXCAVACIONES TUBERIA DE PEAD DESCARGAS

SANITARIAS REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y

PAVIMENTO DE CONCRETO

AMAXAC DE GLIEBREBO TI AYCAIA

PRIMERA SECCION AMAYAC DE CUEPHERO

PRIMERA SECCION, AMIARAC DE GUENIKERO
ENTRE ALVARO ORRICO Y BINO SUAREZ AMAYAC DE CUERPO TIAYCALA

ENIRE ALVARO UBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO,

Y ALVARO OBREGON Y GUERRERO TLAXCALA

\$923 843 06

PROGRAMA:


PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NO. DE ESTIMACIÓN 2F (DOS FINQUITO)

3. GENERADORES

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE MR 30 PREMEZCLADO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABO PULIDO O ESCOBILLADO, JUNTAS FRÍAS CON DISCO DE CORTE A CADA 3 METROS, RAYADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 8-8, INCLUYE MATERIALES CIMENTA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

[illegible]

AREA DE BROCAL = $\pi (.42)^2 = 0.55 \text{ M}^2$

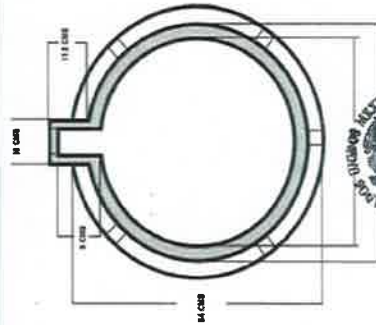

REVISOR:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR

OBRAS PÚBLICAS

IL AVANTAGEMENTO COSTITUZIONALE
ANALAG DE GRO., PLAN. 2024-2027

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

 AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO





MELY8708122T8

CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.

ml vesenia@hotmail.com

PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

CONSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AICOTENCATL EN RE ALVARO DE ARELLANO Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA-AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA DE PEAD, DESCARGAS,

SANITARIAS. REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y

PAVIMENTO DE CONCRETO.

AMAXAC DE GUERRERO. TLAXCALA.

PRIMERA SECCION. AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO Tlaxcala y

ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO

FLAXCALA

CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATADO

PROGRAMA:

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

PERIODO DE EJECUCION D
PERIODO DE ESTIMACION:

NO. DE ESTIMACIÓN

\$923,843.06

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

DEL 16 DE DICIEMBRE
02F (DOS FINIQUITO)

3. GENERADORES

[illegible]

REVISOR:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR DE OBRA

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
BARAHAC DE GRO., YAN. 2024-2027

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR N° 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO: \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACION: 2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS


SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: JUNTA HERMETICA, AFINE DE CEPAS, ACOSTILLADO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CLAVE: ALB-006

CONCEPTO:

PRIVADA XICOHTENCATL

CALLE XICOHTENCATL

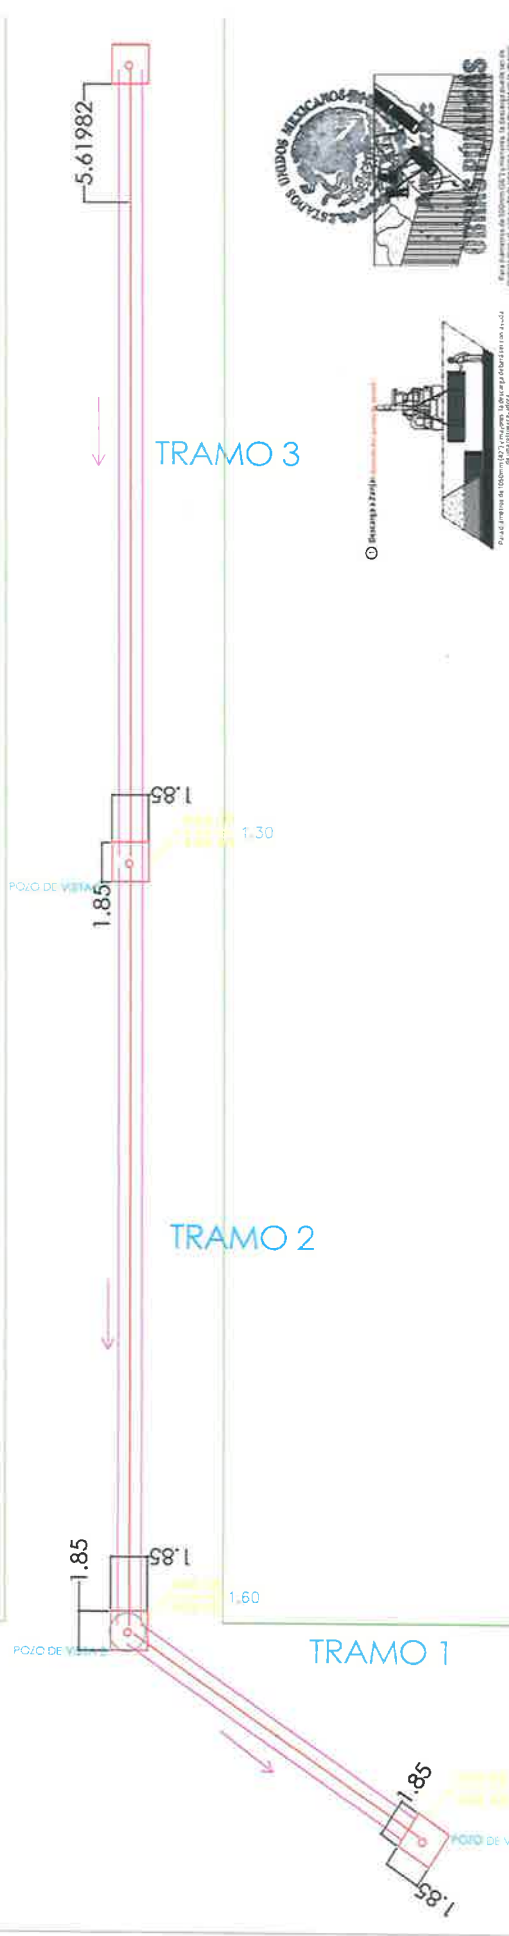


REVISO:

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 1 DE 15

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

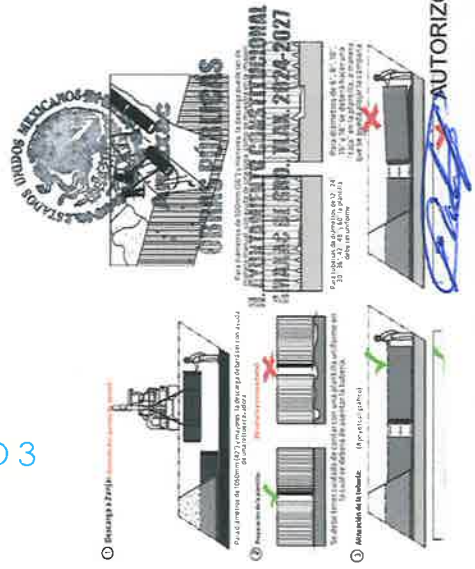

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
mI_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO: \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN: 2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS

CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA EN FORMA CÓNICA DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X12X24 CM DE ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, ESCALERA MARINA CON VARILLA DE NO.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

CLAVE: ALB-012


CONCEPTO:

00+17.80


POZO 2

00+00.00

POZO 1



TRAMO 1

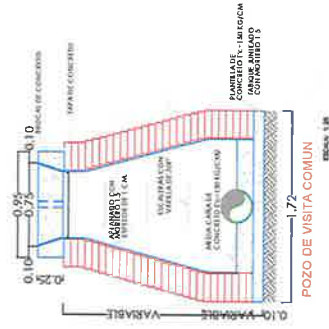

00+54.30

POZO 4

38


00+54.30

POZO 3

36,5

00+17.80

POZO 2



ELABORÓ

REVISÓ:
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 2 DE 15

TRAMO 2

AVANCE CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA, 2024-2027

OBRA PÚBLICA

Amamax



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TÓMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO: \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024



PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACION: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACION: 2F (DOS FINIQUITO)

CLAVE:	ALB-013	CONCEPTO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA POZO DE VISITA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
--------	---------	-----------	---

PRIVADA XICOHTENCATL

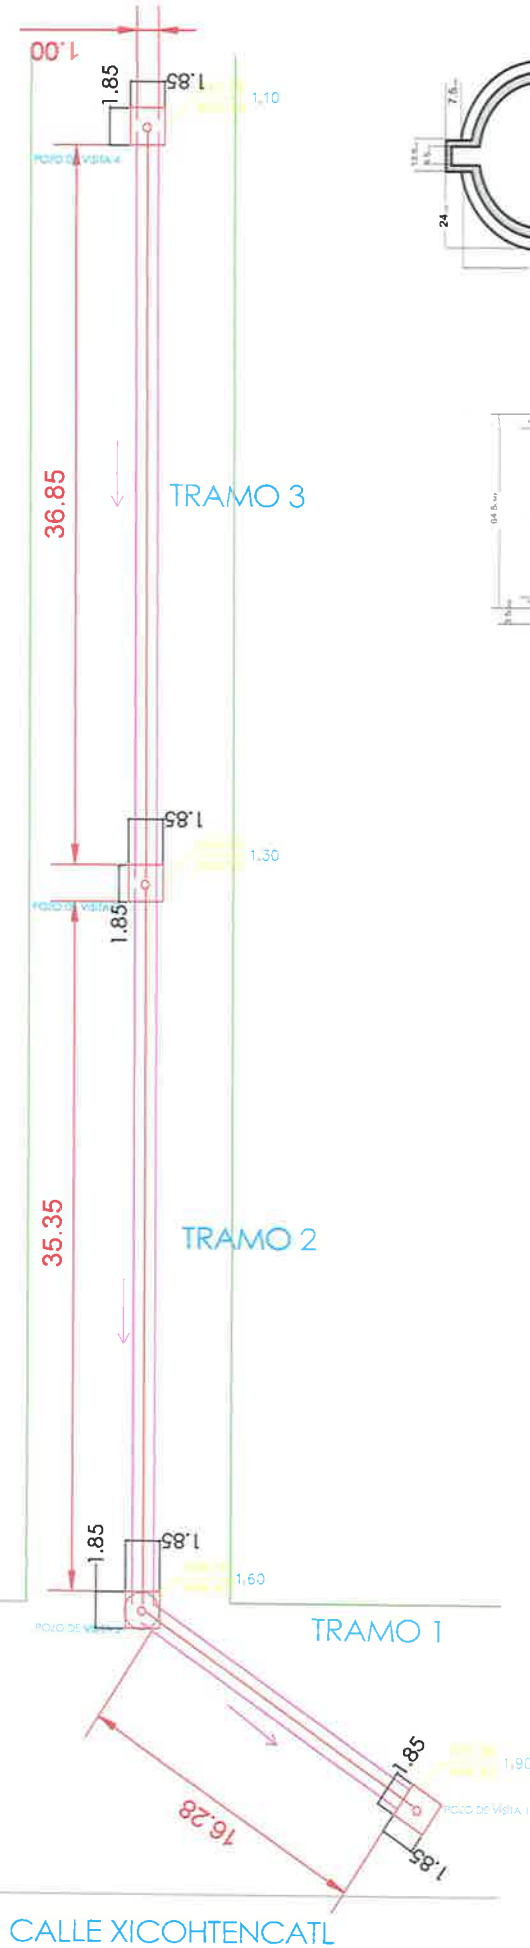

REVISÓ:
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 3 DE 15

ELABORÓ:
ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

OBRA PÚBLICAS

AUTORIZÓ:
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO






ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TÓMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO
ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06
PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NO. DE ESTIMACIÓN: 2F (DOS FINIQUITO)

CLAVE:	ALC-006	CONCEPTO:
		DESCARGA DOMICILIARIA HASTA 6 METROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN HASTA 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, AFINE, TUBERÍA PVC SANITARIO DE 4", CODO DE PVC SANITARIO 45° DE 4", CONEXIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CEPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PRIVADA XICOHTENCATL

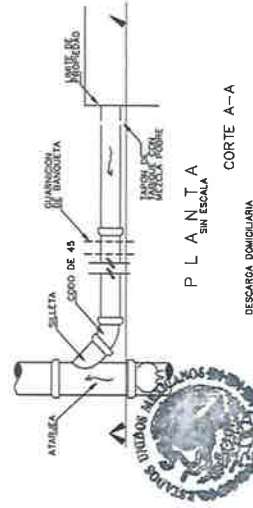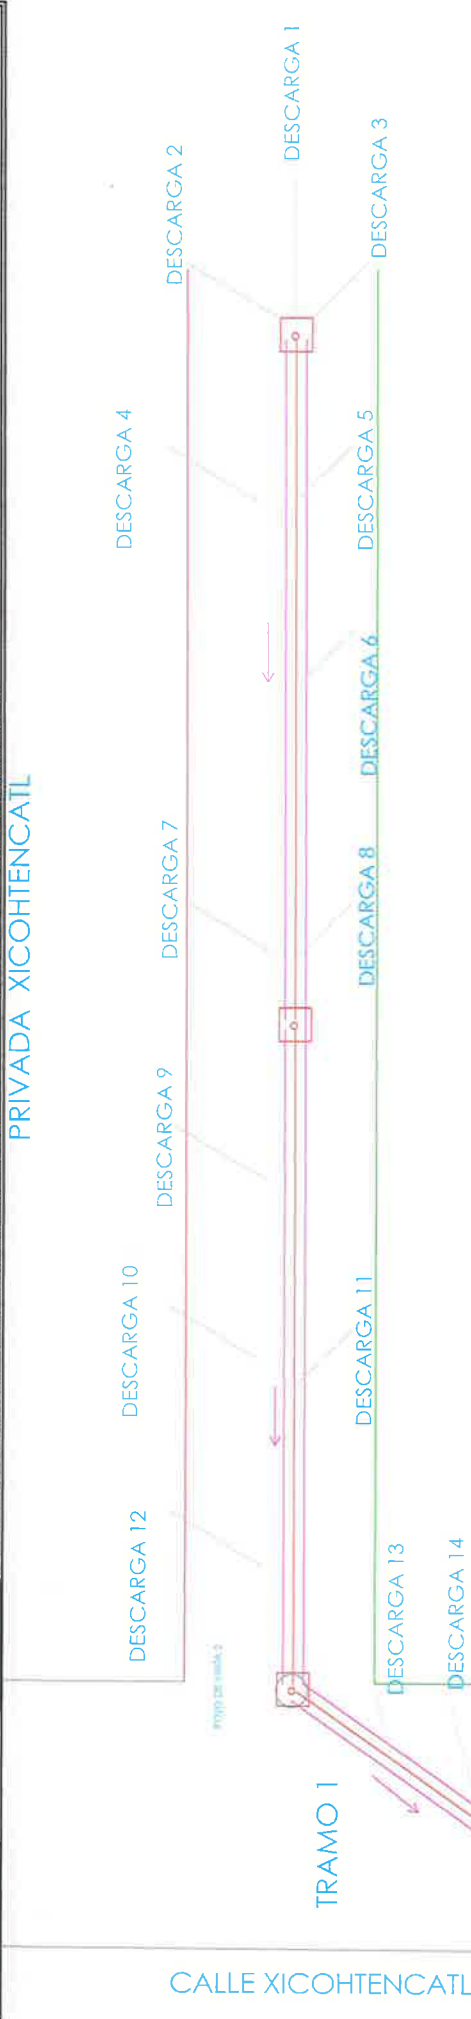

REVISÓ:
CORTE LONGITUDINAL
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 4 DE 15

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

OBRAS PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
AUTORIZÓ




ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TÓMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO
ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06
PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NO. DE ESTIMACIÓN 2F (DOS FINIQUITO)

CLAVE:	TRR-015	CONCEPTO:
		RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

4. CROQUIS

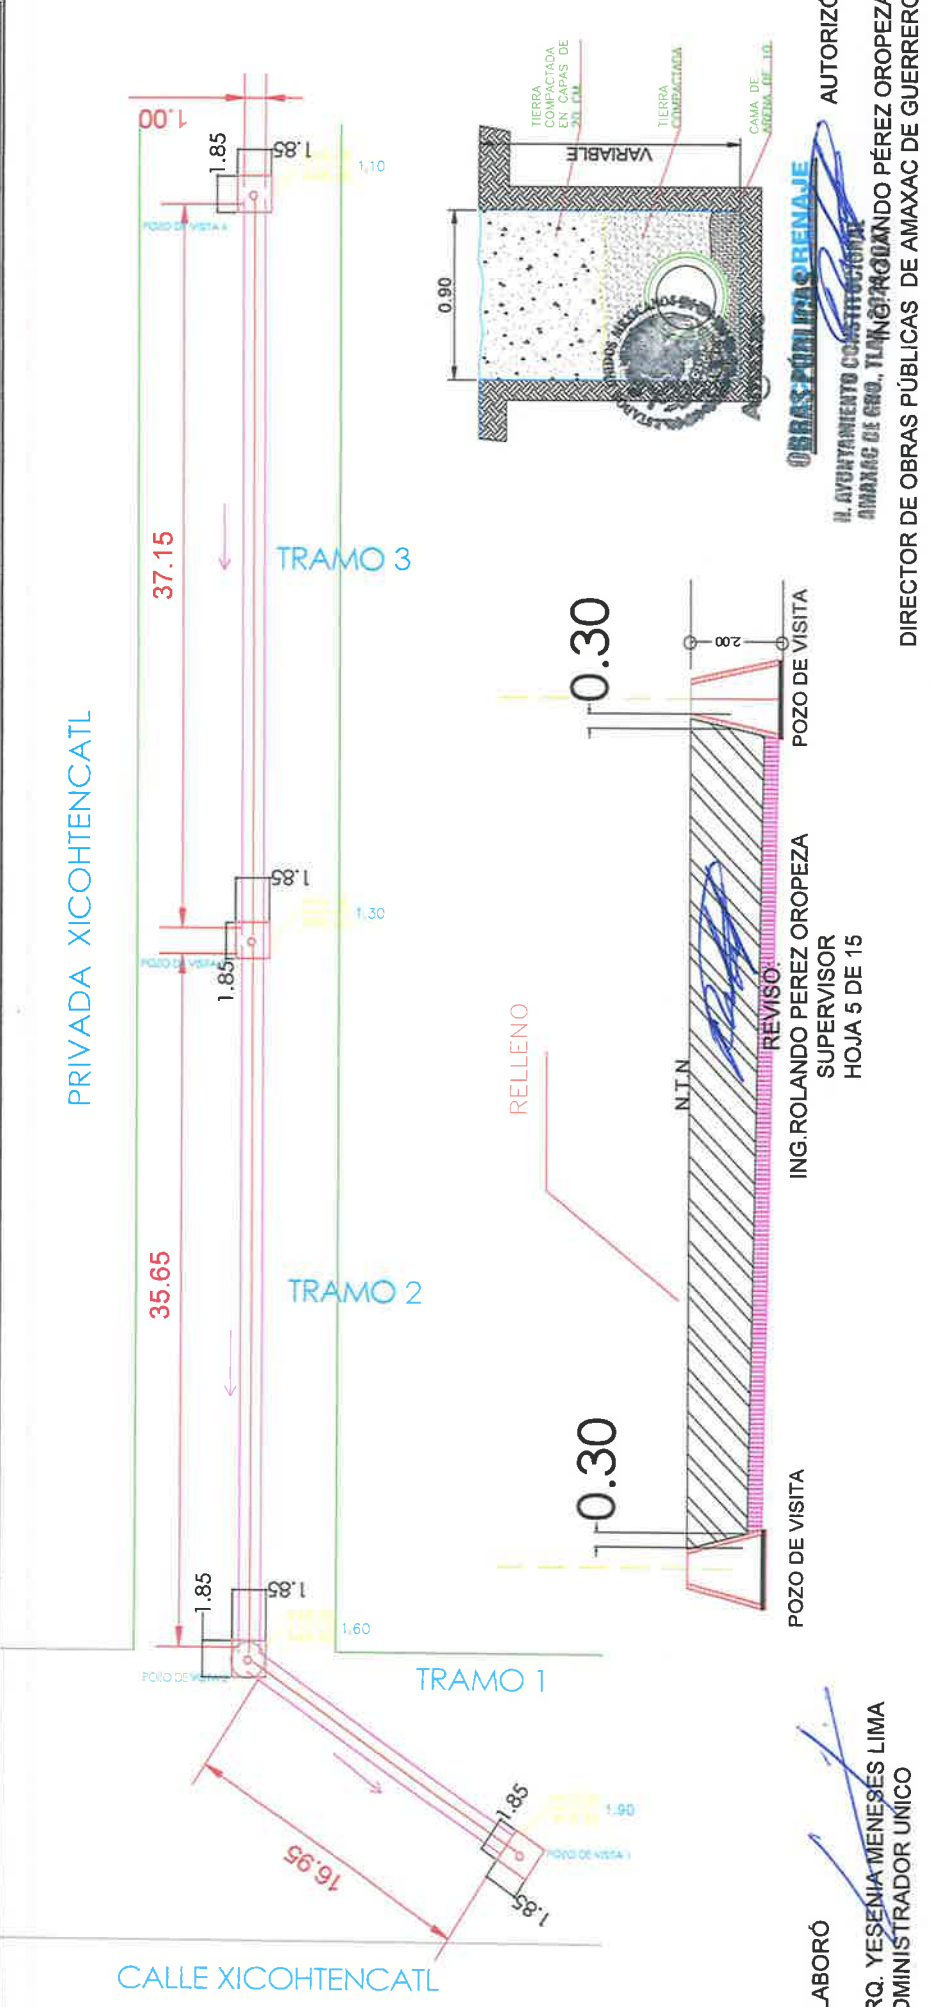



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com




OBRA:	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
CONSISTENTE EN:	SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
LOCALIDAD:	PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO
ENTRE:	ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:	PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$923,843.06
PROGRAMA:	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NO. DE ESTIMACIÓN	2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS

CLAVE:	PAV-001	CONCEPTO:	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. (NO TEZONTLE) COMPREDIDO ENTRE 1700 A 1900 KG/M3, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.
--------	---------	-----------	--

PRIVADA XICOHTENCATL

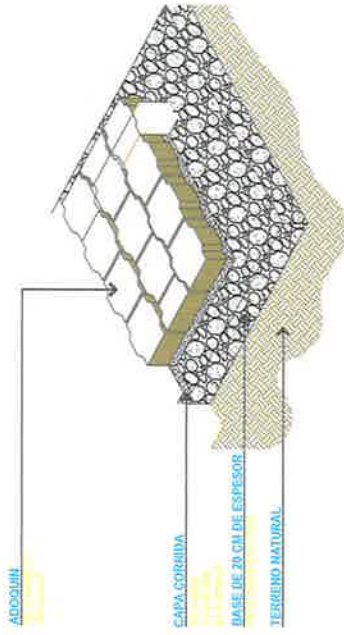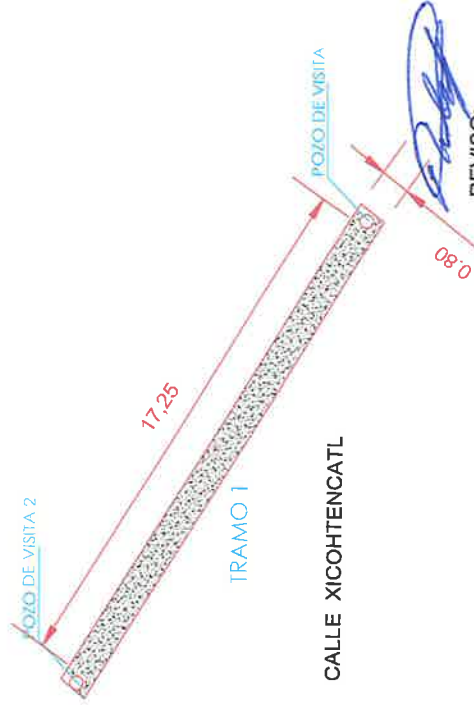

REVISO:
ING.ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 6 DE 15

OBRAS PÚBLICAS

EL AVANTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRD. TLAX. 2024-2027

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

ING.ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TÓMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024




PERIODO DE ESTIMACION: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACION: 2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS

CLAVE:	ADO-003	CONCEPTO:	PAVIMENTO DE ADOCRETO RECUPERADO, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE ARENA CRIBADA PARA EL RELLENO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS ADOCRETOS, BARRIDO DE LOS EXCEDENTES DE ARENA, MANIOBRAS LOCALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.
--------	---------	-----------	--

PRIVADA XICOHTENCATL

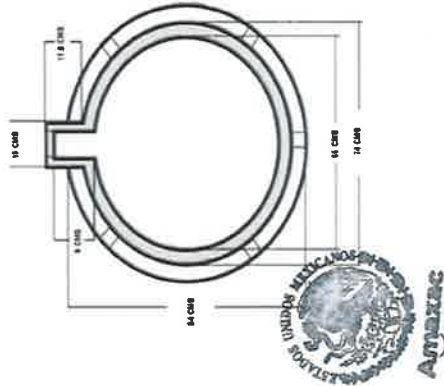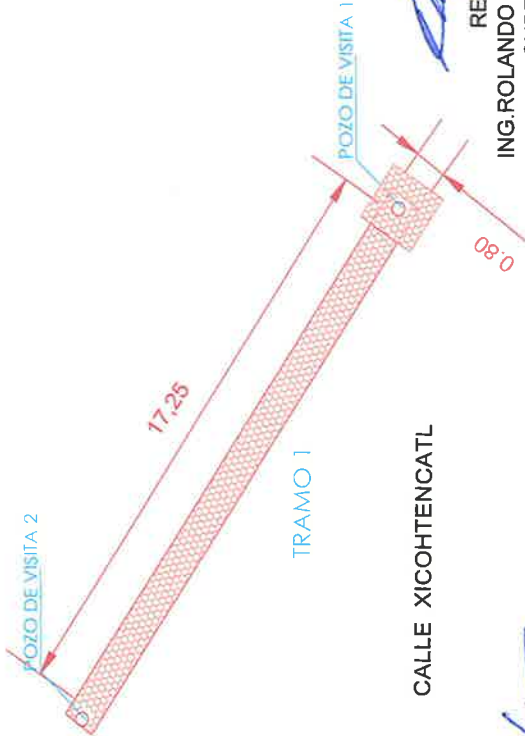

CALLE XICOHTENCATL

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 7 DE 15

ELABORÓ:
ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

OBRAS PÚBLICAS
AUTORIZÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com


OBRA:	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
CONSISTENTE EN:	SANITARIAS, REPARACION DE TÓMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
LOCALIDAD:	PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO
ENTRE:	ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:	PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$923,843.06
PROGRAMA:	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NO. DE ESTIMACIÓN	2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS		
CALLE XICOHTENCATL		
CLAVE:	ALB-006	CONCEPTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 15" DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: JUNTA HERMETICA, AFINE DE CEPAS, ACOSTILLADO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.



PLANTA
CALLE XICOHTENCATL

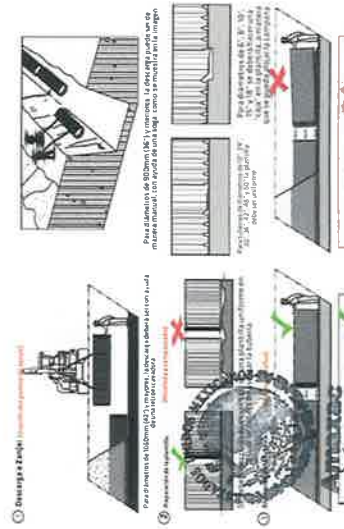

REVISÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 8 DE 15

ELABORÓ
ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA, 2024-2027
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO





ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOTIENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOTIENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO
ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06
PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NO. DE ESTIMACIÓN: 2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS

CLAVE:	ALB-012	CONCEPTO:	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA EN FORMA CONICA DE 1.00 A 1.50 M DE PROFUNDIDAD, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6X12X24 CM DE ESPESOR DE 24 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, APLANADO PULIDO EN SU INTERIOR, FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, ESCALERA MARINA CON VARILLA DE NO.4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.
--------	---------	-----------	---

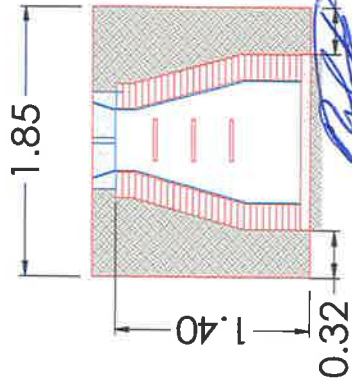

REVISO:
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 9 DE 15

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO



OBRA PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027
AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
mL_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024




PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN: 2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS

CLAVE:	ALB-013	CONCEPTO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD PARA POZO DE VISITA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
--------	---------	-----------	--

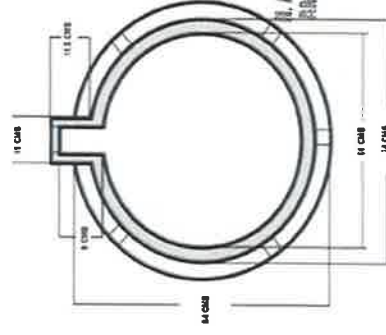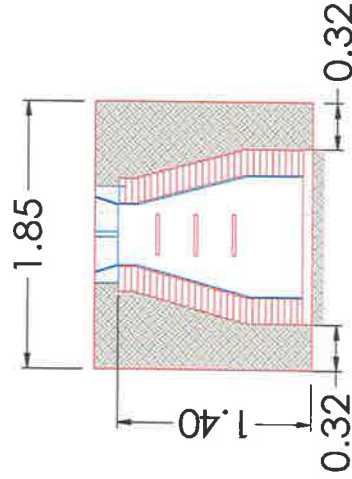

OBRA PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GGO., TLAX., TLAX. 2024-2027

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

REVISÓ:
ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 10 DE 15

AUTORIZÓ

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO: \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024


PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024


NO. DE ESTIMACIÓN: 2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS

CLAVE: REP-001 CONCEPTO: REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS CON TUBO DE POLIDUCTO NEGRO DE 1/2", ABRAZADERAS DE 1/2", INCLUYE; EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II, COLOCACIÓN DE TOMA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

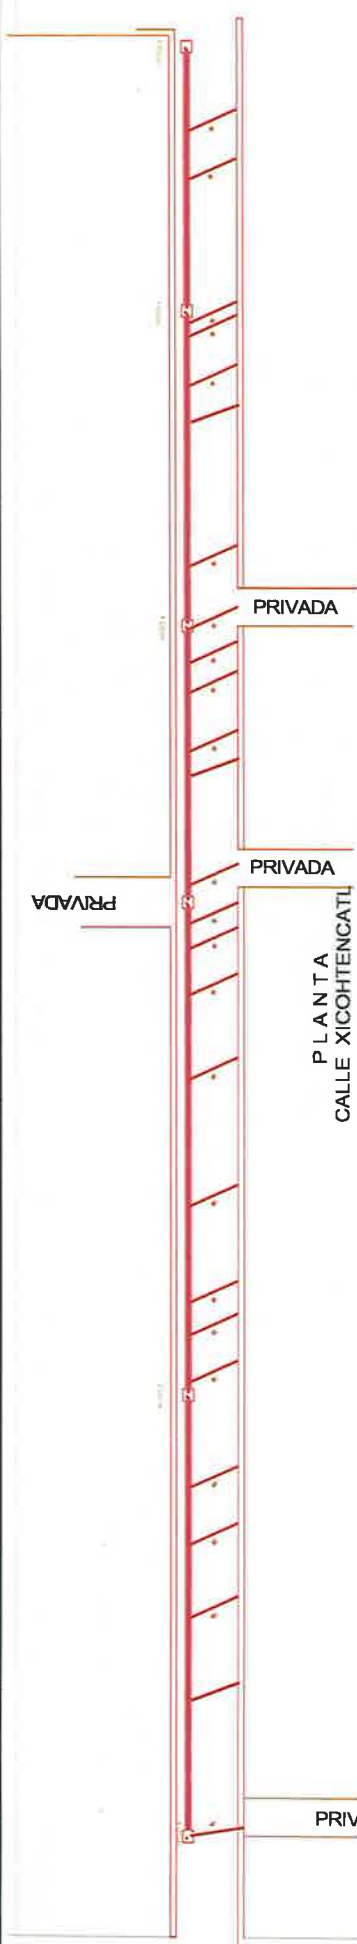

LADO IZQUIERDO

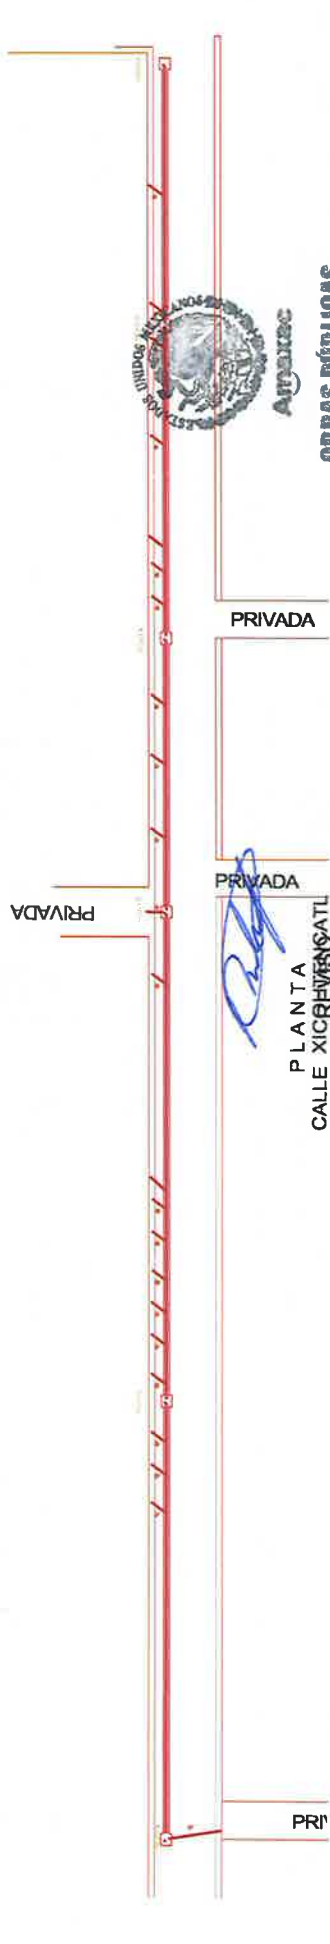

ELABORÓ: ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 11 DE 15

OBRAS PÚBLICAS

ELABORÓ: ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

AUTORIZÓ: ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO





ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TÓMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO
ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06
PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDE) 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NO. DE ESTIMACIÓN: 2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS		
CLAVE:	TRR-015	CONCEPTO: RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS EN CEPAS, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

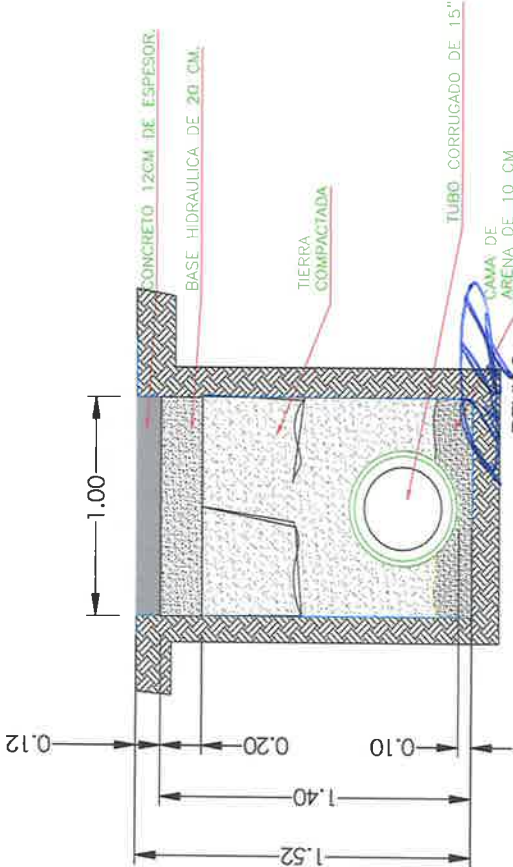

REVISO: **SECCION DE OROPEZA**
SUPERVISOR
HOJA 12 DE 15



OBRA PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GNO., TLAX. 2024-2027

ELABORÓ:
ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO
AUTORIZÓ:
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO




ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
mL_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA-
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.
CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.
LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO
ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06
PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024
NO. DE ESTIMACION: 2F (DOS FINIQUITO)

4. CROQUIS	
CLAVE: PAV-001	CONCEPTO: BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO TRITURADO DE 3/4" A FINOS DE 20 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. (NO TEZONTLE) COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1900 KG/M3. INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.



CONCRETO (12 Cm) F'c = 250 kg/cm 2



BASE HIDRAULICA (20 Cm)

NIVEL DE TERRENO NATURAL

REVISO:
ING.ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 13 DE 15

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO



OBRAS PÚBLICAS

A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRU., TLAX. 2024-2027

1.85
1.40
0.32
0.32

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO



ARQ. YESENIA MENES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDE24-001/PIE2401-010, PRODDE24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDE) 2024



PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACIÓN 2F (DOS FINQUITO)

4. CROQUIS

CLAVE:	PAV-005	CONCEPTO:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE MR 30 PREMEZCLADO DE 12 CM DE ESPESOR, ACABO PULIDO O ESCOBILLADO, JUNTAS FRÍAS CON DISCO DE CORTE A CADA 3 METROS, RAYADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 INCLUYE: MATERIALESCIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
--------	---------	-----------	---

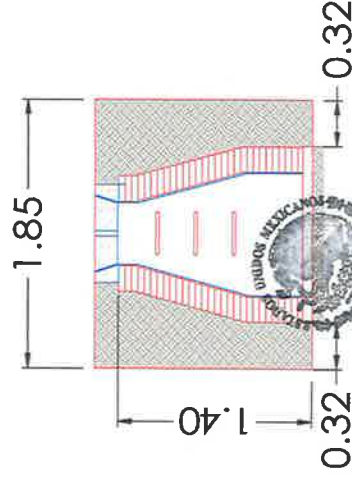

CONCRETO (12 Cm) F'c = 250 kg/cm 2

BASE HIDRAULICA (20 Cm)

NIVEL DE TERRENO NATURAL

ELABORÓ

ARQ. YESENIA-MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

REVISÓ:
ING.ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 14 DE 15

OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024/NOV/07

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AUTORIZÓ



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
MELY8708122T8
CALLE ALLENDE EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
PRIMERA SECCION, ZACATELCO TLAXCALA.
ml_yesenia@hotmail.com

OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.

CONSISTENTE EN: SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO.

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION, AMAXAC DE GUERRERO

ENTRE: ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011

IMPORTE DEL CONTRATADO \$923,843.06

PROGRAMA: PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. DE ESTIMACION 2F (DOS FINIQUITO)


4. CROQUIS

DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO DE 10A 15 CM; DEMOLICION, EXCAVACION HASTA 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, AFINE, TUBERÍA PÉAD SANITARIO DE 6", BOTA DE INSECCION PARA TUBO PÉAD DE 6", CONEXIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CEPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECANICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EXTRA-1

CONCEPTO:

CLAVE:

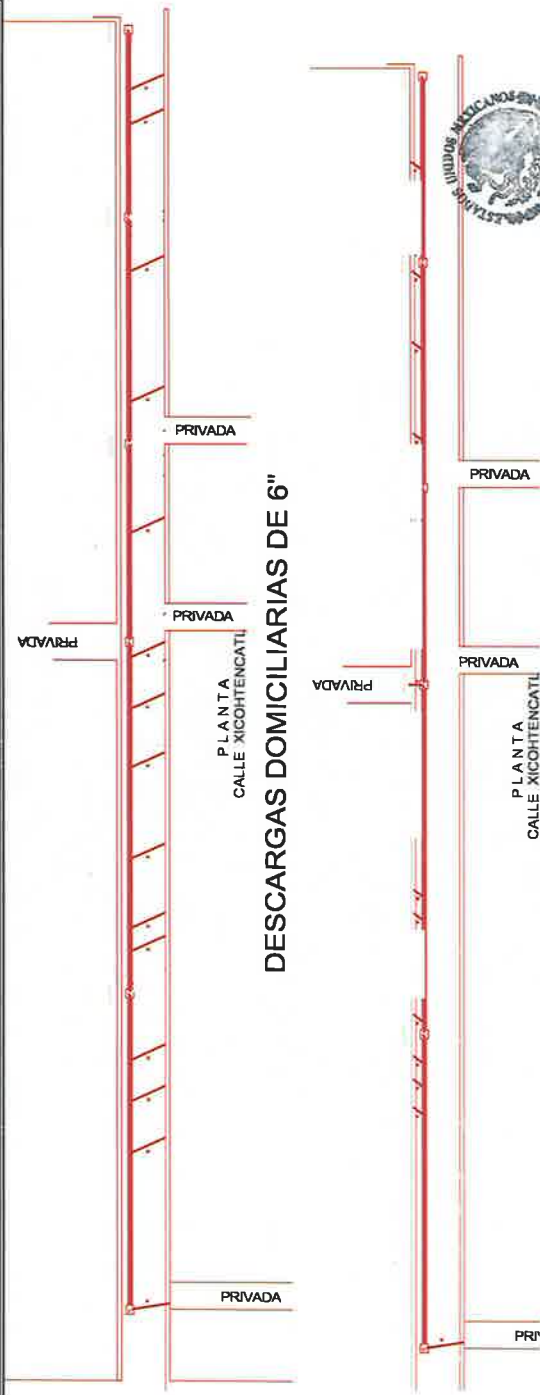

ELABORÓ

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
ADMINISTRADOR UNICO

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
SUPERVISOR
HOJA 15 DE 15

AUTORIZÓ
ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRG., TLAX. 2024-2027

AMAXAC
OBRAS PÚBLICAS

Zacatelco, Tlaxcala a 15 de diciembre del 2024
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PRECIOS
FUERA DE CATALOGO

ING.ROLANDO PEREZ OROPEZA.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO
DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

P R E S E N T E

EL QUE SUSCRIBE **YESENIA MENESES LIMA**, EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA REPRESENTADA POR LA MISMA, SE DIRIGE DE LA MANERA MAS ATENTA Y RESPETUOSA A SU DIGNO CARGO, EN RELACIÓN AL CONTRATO **PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011** DENOMINADA: "CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA-AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICOHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.", CONSISTENTE EN: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERIA *DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO., UBICADA EN ENTRE ALVARO OBREGO Y PINO SUAREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA Y ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.



SOBRE EL PARTICULAR, LE PIDO DE LA MANERA MAS ATENTA LA REVISION Y APROBACIÓN DE LOS PRECIOS FUERA DEL CATALOGO, QUE SE HAN GENERADO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA ANTES MENCIONADA.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
GENERAL DE CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027

ANEXO AL PRESENTE EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
PROCEDIMIENTO NO. : PRODDER24-001/PIE2401-001
NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCATL



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, TUBERÍA DE PEAD, DESCARGAS SANITARIAS, REPARACIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE CONCRETO

ANEXO PE-1

UBICACIÓN: XICHTENCATL ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUÁREZ, AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

ZACATELCO, TLAX. A: 15 DE DICIEMBRE DE 2024

LOCALIDAD: PRIMERA SECCIÓN
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA: 280.00 ML

INICIO: 05 DE DICIEMBRE DE 2024
TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN: 26 DÍAS NATURALES
Página:1/1

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

CLAVE : EXTRA-01

DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO DE 10A 15 CM, DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN HASTA 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, AFINE, TUBERÍA PEAD SANITARIO DE 6", BOTA DE INSECCION PARA TUBO PEAD DE 6", CONEXIÓN, RELLENO CON MATERIAL DE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CEPAS DE 20 CM POR MEDIOS MECÁNICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Unidad: M
Cantidad: 23.00
Precio unitario 185.66
Total 4270.07

	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
TUBO-SANIT-PEAD-6"	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6 " (15.24 CM)	m	1.0000	64.50	64.50
BOT-INSER-PEAD-6"	BOTA DE INSECCION DE 6"	pza	0.2000	200.00	40.00
	LUBRICANTE ADS	LT	0.0100	82.55	0.83
DISCO-CORTE	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO DE 14"	pza	0.0004	2,899.00	1.01
Total de Materiales					106.34
Mano de Obra					
+ CUADRILLA-001	CUADRILLA-001 (1 PEÓN)	jor	0.0300	590.47	17.71
+ CUADRILLA-035	CUADRILLA-035 (AYUDANTE FONTANERO + OFICIAL FONTANERO)	jor	0.0140	1,331.69	18.64
Total de Mano de Obra					36.36
Equipo					
H 6.-	CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO C/KOHLER 14HP- CV160K14	hora	0.0580	106.27	6.16
H 7.-	BAILARINA NEUMÁTICA MARCA WACKER MODELO BS 502I DE GASOLINA DE 700G/M Y PENETRACION DE HASTA 51 CM CON ZAPATA DE 28 X 33 CMS	hora	0.0290	200.56	5.82
Total de Equipo					11.98

Costo directo		154.68
Indirectos de oficina	5.2000%	8.04
Indirectos de campo	5.5000%	8.51
Subtotal		171.23
Financiamiento	0.2756%	0.47
Subtotal		171.70
Utilidad	7.0000%	12.02
Subtotal		183.72
Cargos adicionales 1	0.5000%	0.92
Subtotal		184.64
Cargos adicionales 2	0.5510%	1.02
Precio unitario		185.66

(* CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. *)

ARQ. YESENIA MENESES LIMA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. CRISTIAN SANCHEZ FLORES.

LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN

MECANICA DE SUELOS, RESISTENCIA DE MATERIALES, COMPACTACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO, DISEÑO DE MEZCLAS

AVENIDA PINOS NO. 41, COL. LOMA FLORIDA 2da SECCION, APIZACO, TLAX. TEL. 241 118 53 60

INFORME DE COMPACTACION DE SUBRASANTE EN CEPA P/TUBO

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICHTENCATL ENTRE ALVARO OBREGON Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.		CONTRATO N°:	PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011
UBICACIÓN: AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA		ENSAYES No	1 DE 1
PROGRAMA:	PRODDER 2024 Y PIE 2024	FECHA DE RECIBO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2025
		FECHA DE INFORME:	19 DE DICIEMBRE DEL 2024

TIPO DE MATERIAL :

ARCILLAS INORGANICAS DE BAJA A MEDIA PLASTICIDAD

ENSAYE NUM.	LUGAR	LADO	ESPESOR		% DE HUMEDAD		PESOS ESPECIFICOS KG/CM2		GRADO DE COMPACTACION.
			EN CMS.		LUGAR	OPTIMA	LUGAR	OPTIMO	
ENSAYE UNICO	00+0150	CENTRO	20.00		15.40	17	1474.000	1620.00	91.00
(CALLE XICHTENCATL)									

Carlos Celada Zavala
ADMINISTRADOR UNICO
AV. ZARAGOZA NO. 3302-A
APIZACO, TLAX.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES		ESPECIFICACIONES SCT		
CBR%	15.6	TERR (1)	SY(2)	SR(3)
EXPANSION %	2.6	5	10.00	20.00
P.E SECO SUELTO kg/cm3	1340	5	3.00	2.00
CONTRACCION LINEAL %				
PESO VOL. SECO MAXIMO	1550			
HUMEDAD (W) OPTIMA %	23.1			
LIMITE LIQUIDO %	37.0	50	50	40
LIMITE PLASTICO %	22.4			
INDICE PLASTICO %	14.6			12
DENSIDAD				
ABSORCION %				

COMPOSICION GRANULOMETRICA	T.MAXIMO	3"
	DESPERDICIO	0.0
	MALLA	% QUE PASA
	NUM: 75.000	100
	NUM: 4.750	65
	NUM: 0.425	34
	NUM: 0.075	10

OBSERVACIONES.- LAS MUESTRAS ESTUDIADAS SI CUMPLEN PARA CAPA SUBRASANTE NORMA SCT N -CMT 1-03/16



OBRA PÚBLICA

EL LABORATORISTA TEC. CRISTIAN SANCHEZ FLORES.	EL JEFE DEL LABORATORIO ING. CARLOS CESAR CELADA ZAVALA	EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA Ing. Carlos Celada Zavala ADMINISTRADOR UNICO. AV. ZARAGOZA NO. 3302-A APIZACO, TLAX.
---	--	---



ING. CRISTIAN SANCHEZ FLORES.

LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN

MECANICA DE SUELOS, RESISTENCIA DE MATERIALES, COMPACTACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO, DISEÑO DE MEZCLAS

AVENIDA PINOS NO. 41, COL. LOMA FLORIDA 2da SECCION, APIZACO, TLAX. TEL. 241 118 53 60



Carlos Celada Zavala
ADMINISTRADOR UNICO
AV. ZARAGOZA NO. 3302-A
APIZACO, TLAX.



PRUEBA DE LABORATORIO DE CALLE XICOHTENCATL EN AMAXAC DE GUERRERO

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GR. TLAX. 2024-2027**

EL LABORATORISTA

EL JEFE DEL LABORATORIO

TEC. CRISTIAN SANCHEZ FLORES.

ING. CARLOS CESAR CELADA ZAVALA



ING. CRISTIAN SANCHEZ FLORES.

LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN

MECANICA DE SUELOS, RESISTENCIA DE MATERIALES, COMPACTACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO, DISEÑO DE MEZCLAS

AVENIDA PINOS NO. 41, COL. LOMA FLORIDA 2da SECCION, APIZACO, TLAX. TEL. 241 118 53 60



Carlos Celada Zavala
ADMINISTRADOR UNICO

AV. ZARAGOZA NO. 3302-A
APIZACO, TLAX.



PRUEBA DE LABORATORIO DE CALLE XICOHTENCATL EN AMAXAC DE GUERRERO

OBRAS PÚBLICAS
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GR., TLAX. 2024-2027

EL LABORATORISTA

EL JEFE DEL LABORATORIO

TEC. CRISTIAN SANCHEZ FLORES.

ING. CARLOS CESAR CELADA ZAVALA



ING. CRISTIAN SANCHEZ FLORES.

LABORATORIO DE LA CONSTRUCCIÓN

MECANICA DE SUELOS, RESISTENCIA DE MATERIALES, COMPACTACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO, DISEÑO DE MEZCLAS

118 53 60



PRUEBA DE LABORATORIO DE CALLE XICOHTENCATL EN AMAXAC DE GUERRERO

Amamax

OPERA PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027

EL LABORATORISTA

EL JEFE DEL LABORATORIO

TEC. CRISTIAN SANCHEZ FLORES.

ING. CARLOS CESAR CELADA ZAVALA

Carlos Celada Zavala
ADMINISTRADOR UNICO
CALLE ZARAGOZA NO. 3302-A
AMAXAC, GRO.


INFORME DE PRUEBAS DE CONCRETOS

LABORATORIO DE CALIDAD FORTACRETO
METODO EMPLEADO NMX-C-083,109,155,156,159,160,161,162,-ONNCCE VIGENTE

FECHA DE INFORME: 28 de enero del 2025.
CLIENTE: Yesenia Meneses Lima.
OBRA o DIRECCION: Calle Xicohtencatl, Tlaxcala. Fortacreto - Tlaxcala.
FECHA DE COLADO: 30 de diciembre del 2024.
LABORATORIO:

FOLIO:
RFPC-051-2024
VERSION:
1

No. Muestra	Fecha de Muestreo	f'c/m'r de Proyecto	Articulo	Rev. Cm	P Vol. kg/m3	3 Dias kg/cm²	% f'c/m'r 3 Dias	7 Dias kg/cm²	% f'c/m'r 7 Dias	14 Dias kg/cm²	% f'c/m'r 14 Dias	28 Dias kg/cm²	28 Dias kg/cm²	Prom. 28 Dias kg/cm²	% f'c/m'r 28 Dias
TL-766	30/12/24	MR-30	CMR-30N20C14B	17	2,295	172	69	205	82	-----	-----	278	272	275	110

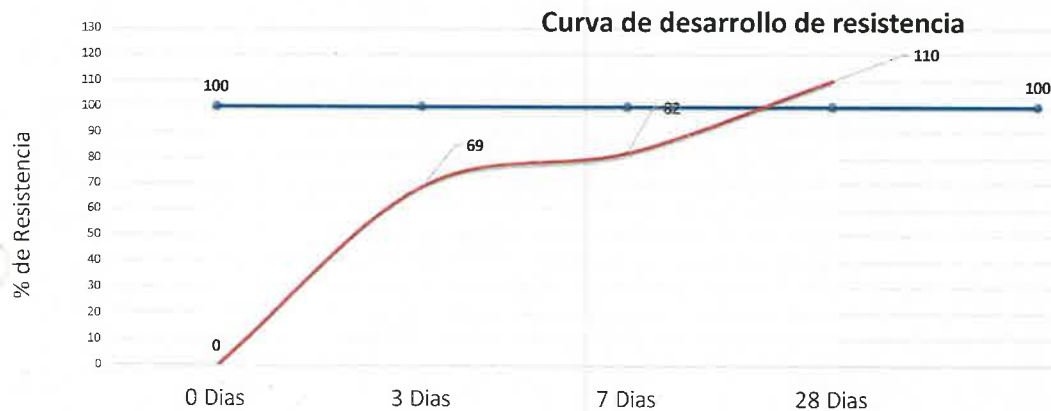

OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027

Los resultados obtenidos a edades iniciales, cumplen satisfactoriamente con el porcentaje de desarrollo de resistencia requerida.

Las muestras elaboradas, se realizaron de manera aleatoria en base a la frecuencia de muestreo establecido en el Sistema de Gestion de Calidad de Fortacreto.

PROMEDIO kg/cm ²	17	2295	172	69	205	82	0	0	278	272	275	110
DESV. STD. kg/cm ²	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
COEFIC. DE VARIACIÓN %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0

ELABORÓ:

Tec. Armando Garcia

Control de Calidad - Fortacreto

APROBÓ:

Arq. José A. Galicia Duran.

Cordinador de Calidad Puebla- Tlaxcala.

CARTA GARANTIA

Fecha de Expedición: 30 de diciembre del 2024

Ubicación del Proyecto: Calle Xicohtencatl S/N Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.

Cliente: Yesenia Meneses Lima

Planta Dosificadora: Planta San Matías Tepetomatitlan

Reporte: RFPC-CAR-060-2024

Versión: 1.2-2024

Estimado cliente, por este medio me permito extenderle la siguiente "**Carta Garantía**" la cual asegura que el concreto que se suministró en su obra cumple satisfactoriamente las pruebas de resistencia a compresión establecidas, con apego a la norma en vigor: Especificaciones generales para concretos industrializados "**NMX-C-155 Concreto Hidráulico**", y que es representativo del volumen proporcionado.

- Código del producto: C250T20C14B.
- Concreto Convencional.
- Resistencia a compresión 250 kg/cm².
- Edad de garantía, 21 días.
- Tma 20 mm, Caliza.
- Revenimiento 14 cm. ± 3.5 cm.
- Tiro directo.

Los resultados del ensaye en cilindros sometido a compresión serán compartidos a edad de garantía para tranquilidad del cliente y sustento de la presente carta garantía, con lo que se garantiza **el correcto desempeño de la resistencia en el concreto**.

REFERENCIAS:

ESPECIFICACIONES

NMX-C-111-ONNCCE - 2014

NMX-C-122-ONNCCE - 2004

NMX-C-155-ONNCCE - 2014

NMX-C-255-ONNCCE - 2013

NMX-C-414-ONNCCE - 2014

Agregados para concreto hidráulico

Agua para concreto

Concreto hidráulico – especificaciones y método de ensayo

Aditivos químicos para concreto

Cementos hidráulicos

MÉTODOS DE PRUEBA

NMX-C-083-ONNCCE - 2014

NMX-C-109-ONNCCE - 2013

NMX-C-156-ONNCCE - 2010

NMX-C-160-ONNCCE - 2004

NMX-C-161-ONNCCE - 2013

NMX-C-162-ONNCCE - 2014

Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto

Cabeceo de especímenes cilíndricos

Determinación del revenimiento en el concreto fresco

Elaboración y curado en obra de especímenes de concreto

Concreto fresco- Muestreo

Determinación de la masa unitaria del concreto fresco.



Amamaxac

OBRAS PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027

Arq. José. A. Galicia Duran

Coordinador de Calidad, Fortacreto Puebla-Tlaxcala.



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
CALLE ALLENDE
EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
TEL. CEL- 246-294-50-03 246-109-07-44

NOTA NO.10

FECHA: 16/12/2024

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO QUE SE SIGUE COLOCANDO TUBERÍA DE 12 PULGADAS EN LA PRIVADA XICOHTENCATL, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA CALLE XICOHTENCATL SE CONTINUA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE 15" Y ES AUTORIZA LA UBICACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA DE LA PRIVADA XICOHTENCATL PARA SU INICIO DE CONSTRUCCIÓN. SE ENTREGA UN PRECIO EXTRAORDINARIO DEL CONCEPTO DE DESCARGA SANITARIA PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.

ING. ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO.

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRU. TLAX. 2024-2027

NOTA NO.11

FECHA: 19/12/2024

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC QUE SE SIGUE REALIZANDO EL RELLENO Y COMPACTADO DE LA CEPA DONDE SE COLOCÓ TUBERÍA ADEMÁS DE INICIAR CON LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DE PRIVADA XICOHTENCATL, LA EXCAVACIÓN PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE XICOHTENCATL Y LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DOMICILIARIAS EN CALLE XICOHTENCATL.

ING. ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO.

OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRU. TLAX. 2024-2027



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
CALLE ALLENDE
EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
TEL. CEL- 246-294-50-03 246-109-07-44

NOTA NO.12

FECHA: 23/12/2024

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC QUE SE FINALIZAN LAS EXCAVACIONES EN PRIVADA Y CALLE XICOHTENCATL CON RETROEXCAVADORA EN ZANJA PARA TERMINAR LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL, COLOCACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y POZOS DE VISTA.



Amamax

OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO., TLAX. 2024-2027

ING. ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO.

NOTA NO.13

FECHA: 26/12/2024

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC QUE SE TERMINA LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA EN PRIVADA CALLE XICOHTENCATL, ADEMÁS SE COLOCA LA BASE HIDRÁULICA PARA RECOLOCACIÓN DEL ADOQUÍN DE PRIVADA XICOHTENCATL EL CONTRATISTA DA AVISO A SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA COLAR EL DÍA 30 DE DICIEMBRE EL PAVIMENTO DE CONCRETO MR-30.

ING. ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO.



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
CALLE ALLENDE
EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
TEL. CEL- 246-294-50-03 246-109-07-44

NOTA NO. 14

FECHA: 28/12/24

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC SE INICIA EL CIMBRADO DE LA DELIMITACIÓN DE ZANJA LA CUAL SE COLOCARÁ CON CONCRETO HIDRÁULICO MR-30 PREMEZCLADO DE 12 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 6-6. SE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN NO 2F (DOS FINIQUITO) PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.



OBRAS PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GBO. TLAX. 2024-2027

ING. ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO.

NOTA NO.15

FECHA: 29/12/2024

CON ESTA FECHA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO HACE ENTREGA AL CONTRATISTA DE LA ESTIMACIÓN 2F (DOS FINIQUITO) PARA QUE ATIENDA LAS CORRECCIONES INDICADAS. ASÍ COMO TAMBIÉN SE LE INFORMA QUE EL PRECIO EXTRAORDINARIO ENTREGADO A SIDO AUTORIZADO POR LO CUAL DEBE DE INTEGRARSE AL CUERPO DE ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. CONTRATISTA TERMINA CIMBRADO DE DELIMITACIÓN DE ZANJA PARA COLADO, ASÍ COMO TAMBIÉN REALIZA LA LIMPIEZA DE PRIVADA Y CALLE XICOHTENCATL.

ING. ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO.



ARQ. YESENIA MENESES LIMA
CALLE ALLENDE
EXTERIOR No 33 LOCAL "A"
TEL. CEL- 246-294-50-03 246-109-07-44

NOTA NO.18

FECHA: 30/12/2024

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE AMAXAC DE GUERRERO QUE SE REALIZA COLADO DE ZANJA CON CONCRETO MR-30 EN CALLE XICHTENCATL. ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 2F (DOS FINIQUITO). SUPERVISIÓN DE AMAXAC DE GUERRERO AUTORIZA LA ESTIMACIÓN 2F (DOS FINIQUITO) CON UN IMPORTE ESTIMADO DE:

SUBTOTAL \$ 419,851.78
IVA \$ 77,176.28
TOTAL \$ 487,028.06

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA SUPERVISIÓN DE AMAXAC DE GUERRERO EL TÉRMINO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCATL ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA-AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA XICHTENCATL ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA.". CON EL CONTRATO NO.PRODDER24-001/PIE2401-010, PRODDER24-001/PIE2401-011 DEL PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2024 Y FONDO DE PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 2024 CON UN IMPORTE DE \$ 923,843.06 (NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.) Y PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.



Amaxac

OBRAS PÚBLICAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GTO, TLAX. 2024-2027

ARQ. YESENIA MENESES LIMA.
ADMINISTRADOR UNICO

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO.

ING. ARMANDO LOPEZ SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ROLANDO PEREZ OROPEZA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO.
