



PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL

PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE; RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE; PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
XICOHTENCATL

ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
AMAXAC DE GUERRERO. TLAXCALA

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC161111S8

CONTRATO:
IMPORTE DEL CONTRATO **\$1,098,234.00**

IMPORTE DEL CONTRATO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PROGRAMA:	DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE EJECUCION DEL	DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACION:	01 (UNO)
NO. DE ESTIMACION	

[illegible]

REALIZÓ

Armas Proyectos y Construcción S.
RFC: APC1601111S8

REALIZO  CALLE SIN NOMBRE 109-10 417
CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ ANITA HUILOAC. A: ANITA HUILOAC
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S DE RL DE C.V. 2022
Carreo: 2022carro: 2022

AUTORIZÓ

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS

Amazac

SECRETARIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
E. MOVIMIENTO CONSTITUCIONAL
2023-2027

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC161111158

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILLOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC161111158

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL

PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO

DE CONCRETO HIDRAULICO

XICOHTENCATL

ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2C
PERIODO DE EJECUCION DEL DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

2. CUERPO DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.D. M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		EXCEDENTE	FALTANTE
						CANTIDAD	IMPORTE		
TERR-7-1	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS. INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T	M2	332.09	\$ 33.13	\$ 10,670.84	1,139.69	\$ 37,757.93	807.60	\$ 27,087.09
APOT-000	CAMA DE ARENA EN CEPA PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	322.09	\$ 54.70	\$ 17,618.32	-	\$ -	-	\$ 322.09
APOT-009-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE DIAMETRO 6" (15 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRAULICAS.	ML	578.00	\$ 520.67	\$ 300,947.26	538.707051	\$ 280,488.60	-	\$ 39,292949
APOT-008-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO HIDRAULICO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE DIAMETRO 4" (10 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRAULICAS.	ML	3.50	\$ 310.82	\$ 1,087.87	-	\$ -	-	\$ 3.50
APOT-38-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO CAMBIA A HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 210.71	\$ 421.42	-	\$ -	-	\$ 2.00
APOT-043-2	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO DE 40 CM CEMENTAR 64 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 350.74	\$ 1,052.22	-	\$ -	-	\$ 3.00
APOT-045-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 106.45	\$ 319.35	-	\$ -	-	\$ 3.00
APOT-048-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE COPLE HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 410.27	\$ 820.54	-	\$ -	-	\$ 2.00
APOT-017-2	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE CODO HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 45°, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 1,085.33	\$ 2,170.66	-	\$ -	-	\$ 2.00
APOT-067-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6" A 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	\$ 654.94	\$ 1,309.88	-	\$ -	-	\$ 2.00
APOT-048-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE COPLE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 414.45	\$ 414.45	-	\$ -	-	\$ 1.00



REALIZÓ

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
RFC: APC16111158

CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
C.P. 90407

Correo: 2022armah@gmail.com

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
ACAYAC DE GRO. TOL. 2024-2027

1720



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC16111111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC16111111S8

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL

PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO

DE CONCRETO HIDRAULICO

XICOHTENCATL

ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: FISM 2501/003-01

IMPORTE DEL CONTRATO \$1,098,234.00

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2C

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

2. CUERPO DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		EXCEDENTE	FALTANTE	
						CANTIDAD	IMPORTE		CANTIDAD	IMPORTE
APOT-75	SUMINISTRO Y CONEXION DE YEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 3,147.15	\$ 3,147.15	-	\$ -	-	1.00	\$ 3,147.15
APOT-067-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE REDUCCION BUSHING DE 6" A 4" DE PVC HIDRAULICO CED. 40, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 654.94	\$ 654.94	-	\$ -	-	1.00	\$ 654.94
APOT-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 4", INCLUYE: TORNILLOS (5/8" x 3 1/2") CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 4,712.98	\$ 18,851.92	-	\$ -	-	4.00	\$ 18,851.92
APOT-004	CONEXION DE TOMA DOMICILIO DE AGUA POTABLE EN CALLE DE PVC CED. 40 DE 6", INCLUYE: HIDRÓFONO DE 6" X 1/2" CONector DE BRONCE DE 1/2" ABRAZADERAS SIN ENDE 6" M. DE 3/4" BRONCE DE 1/2" COLOR NEGRO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	60.00	\$ 1,244.63	\$ 74,677.80	-	\$ -	-	60.00	\$ 74,677.80
TERR-9	RELLENO CONTRAQUE DE 6" DE 3/4" CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 15 CM. CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	295.45	\$ 179.46	\$ 53,021.46	-	\$ -	-	295.45	\$ 53,021.46
APOT-030	SUMINISTRO Y CONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO DE 2", INCLUYE: EXTREMIDADES BRIDADA DE ESPIGA Y CAMPANA EN PVC, EMPUJOS DE NEOPRENO, TORNILLOS VOLANTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 9,024.48	\$ 9,024.48	-	\$ -	-	1.00	\$ 9,024.48
APOT-100	ABRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M. PARA TUBO DE 102 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	PZA	1.00	\$ 475.30	\$ 475.30	-	\$ -	-	1.00	\$ 475.30
APOT-101	ABRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M. PARA TUBO DE 152 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	PZA	1.00	\$ 403.80	\$ 403.80	-	\$ -	-	1.00	\$ 403.80



REALIZÓ



Armah Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
RFC: APC16111111S8

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com

AUTORIZO

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
RFC: APC16111111S8

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS
A AUTORIZACION CONSTITUCIONAL
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com



AUTORIZO

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
A AUTORIZACION CONSTITUCIONAL
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com

30



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC1611111S8

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL

PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO

DE CONCRETO HIDRAULICO

XICOHTENCATL

ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: FISM 2501/003-01

IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2C

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

2. CUERPO DE ESTIMACIÓN

CLAVE	CONCEPTO O PARTIDA	U.D.M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN 1 (UNO)		EXCEDENTE	FALTANTE
						CANTIDAD	IMPORTE		
APOT-026	REGISTRO HIDRAULICO DE 1.00 X1.00 M Y HASTA 1.50 CM DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, MARCO DOBLE Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 50X50 CM.-INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, CAMA DE GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR EN EL FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 13,236.26	\$ 13,236.26	-	\$ -	-	1.00 \$ 13,236.26
3	PAVIMENTACION								
CARR-015	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RR-2K EN RAZON DE 1.5 LTS/M2, APLICADO POR ENCIMA DEL PAVIMENTO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACABADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.51	\$ 31.49	\$ 267.98	-	\$ -	-	8.51 \$ 267.98
CARR-2-1	CARPETA DE MEZCLA DE 10 CM DE ESPESOR, TENDIDO MANUAL Y (3/4") DE DIAMETRO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	8.51	\$ 278.51	\$ 2,370.12	-	\$ -	-	8.51 \$ 2,370.12
PAV-2-1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE MR 30 PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, JUNTAS FRIAS CON DISCO DE CORTE A CADA 3 METROS, RAYADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 6-6, ANTISOL BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	589.65	\$ 594.97	\$ 350,824.06	-	\$ -	-	589.65 \$ 350,824.06
SUBTOTAL					\$ 946,753.45		\$ 445,043.94	\$ 90,975.50	\$ 592,685.00
I.V.A. 16%					\$ 151,480.55		\$ 71,207.03	\$ 14,556.08	\$ 94,829.60
TOTAL					\$ 1,098,234.00		\$ 516,250.97	\$ 105,531.58	\$ 687,514.60

OPERADO FISM



Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
RFC: APC1611111S8

CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA

SANTA ANITA HUILOAC, A.

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. 9C407

Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. 9C407

AUTORIZO

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. 9C407

SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS



AUTORIZO

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. 9C407

SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V. 9C407

SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

1731

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

**ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE XICOHTENCATL
CALLE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:	

CONTRATO:	FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$ 1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO DEL 2000
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 13 DE MAYO DEL 2000
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC161111S8

3. GENERADORES

TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL
	1	1.00	288.00	2.40			M2	691.20
	2	1.00	5.21	2.06			M2	10.73
						TOTAL	M2	701.93

OBSERVACIONES

**OPERADO
FISM**

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. de RL de CV
C.P. 90407
ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
1732

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

**ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE; PAVIMENTO DE XICOHTENCATL
CALLE: ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUÁREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC161111S8

CONTRATO:	FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$ 1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRA
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 13 DE MAYO
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

3. GENERADORES

CORTE DE PAVIMENTO DE ASFALTO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 10 CM. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA

[illegible]

OBSERVACIONES



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATLASCALCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAYORALTILO CONSTITUCIONAL
UNIDAD DE CAD. TLA 1978-7977

2000

Amah Proyectos y Construcción S. de RL
REC: APC/2011/158

CALLE SIN NOMBRE 109-10 412
SANTA ANITA HUILOAC, A
C.P. 90407

Correo: 2022armah@grm.com

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

REALIZÓ

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

733

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

**ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE XICOHTENCATL
CALLE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL: 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

FISM 2501/003-01	
CONTRATO:	
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO DEL 2001
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 13 DE MAYO DEL 2001
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

FISM 2501/003-01
\$1,098,234.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
01 (UNO)

3. GENERADORES

EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.

[illegible]

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAR PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE RL.
C.P. 90407
SANTA ANITA HUILAR, M.
Correo: carlosdiaz@armar.com.mx

Armah Proyectos y Construcción S. de RL
REC: APC130001158

AUTORIZO:
ARG. CAROLINA VAZQUEZ CORREA,
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS,

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE
ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHOHTECATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED
DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE
XICHOHTECATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN: 01 (UNO)

3. GENERADORES

CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA,
INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

GENERADOR							OBSERVACIONES	
CLAVE:	PRE-11	CONCEPTO:	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL		
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL
	2	2.00	288.00	0.022	0.10		M3	12.67
	3	1.00	288.00	2.40	0.10		M3	69.12
	4	1.00	5.21	2.06	0.06		M3	0.64
	5	1.00	230.00	2.40	0.10		M3	55.20
	6	1.00	65.00	1.52	1.10		M3	108.68
					FACTOR DE ABUNDAMIENTO TIERRA		1.30	229.52
					FACTOR DE ABUNDAMIENTO CONCRETO		1.50	104.65
					TOTAL		M3	334.16

OPERADO FISM

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO DE GUERRERO, TLAXCALA
R.F.C. APC1611111S8

armah

REALIZÓ
CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO
CORREO: 2022armah@gmail.com

AUTORIZO
ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS
R.F.C. APC1611111S8

AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO DE GUERRERO, TLAXCALA
R.F.C. APC1611111S8

AUTORIZO
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
R.F.C. APC1611111S8

1737

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

**ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE XICOHTENCATL
CALLE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:	

CONTRATO:	FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO DEL 2001
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 13 DE MAYO DEL 2001
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL: 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC161111S8

3. GENERADORES

COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESUBIERTA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T

EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL
	1	1.00	288.00	1.52			M2	437.76
	2	1.00	5.21	2.06			M2	10.73
	3	1.00	288.00	2.40			M2	691.20
						TOTAL	M2	1,139.69

Q. The same?

3

Armah Proyectos y Construcción S. de RL
RFC: APC12011738

REALIZÓ

CALLE SIN NOMBRE 109-10 471 51

SANTA ANITA HUILOAC, A.
CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
C.P. 90407

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

LA LEY DE ASESORIA JURIDICA
FUE APROBADA POR LA COMISION
DE LA LEY DE ASESORIA JURIDICA
EL DIA 20 DE ABRIL DE 1994
EN LA CIUDAD DE BOGOTA

REPUBLICA DE COSTA RICA
TRIBUNAL MUNICIPAL
SAN JOSÉ
CALLE 207A-207B



AUTORIZO

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
AUTORIDAD DEL AGUA, JUL 2024-2027

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

**ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE; PAVIMENTO DE XICOHTENCATL
CALLE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:	

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC161111S8

CONTRATO:	FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$ 1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRA
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 13 DE MAYO
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

3. GENERADORES

SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE DIAMETRO 6" (15 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRAULICAS.

GENERADOR									OBSERVACIONES
EJE	TRAMO	NO. PZAS	LARGO	ANCHO	ALTO 1	ALTO 2	UNIDAD	SUBTOTAL	
	1	1.00	269.3535255				ML	269.3535255	TUBERIA ALIMENTACION
	2	1.00	269.3535255				ML	269.3535255	TUBERIA DE DISTRIBUCION

OBSERVACIONES

TUBERIA ALIMENTACION
TUBERIA DE DISTRIBUCION

OPERADO

Armah Proyectos y Construcción S. de RL de CV
PFC-4213-11158

CALE SIN NOMBRE 109-10 417A
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C. P. 90407

REALIZÓ

Correo: 2022armar@gmail.com

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO CONSTRUCCION

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

WARRANTS TO CONSTITUTE



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILLOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

4. CROQUIS

TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

CONCEPTO:


PRE-1

CLAVE:

CALLE ALVARO OBREGÓN (VIA)



CALLE PINO SUAREZ LA CRUZ

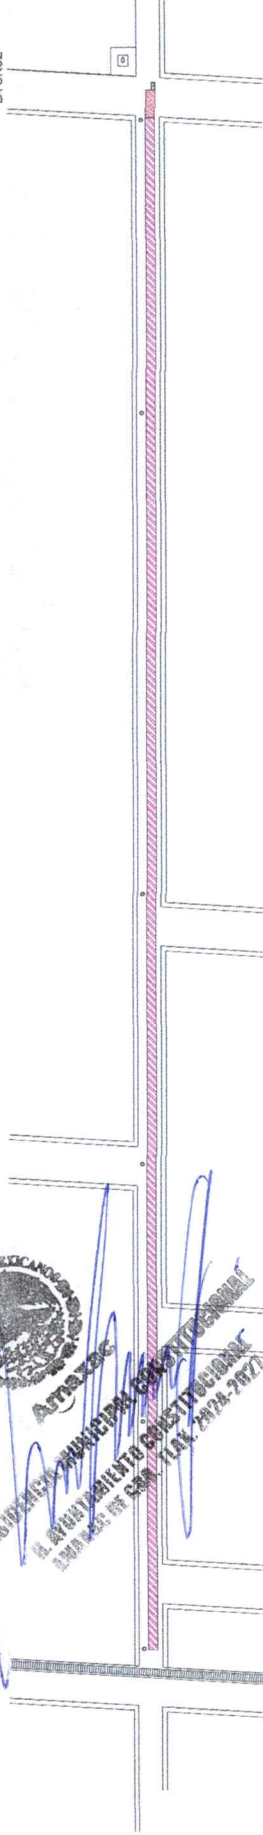

286.00

5.21

2.40

OPERADO FISM



CARPETA ASFALTICA

PAVIMENTO DE CONCRETO


armah

Armah-Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4T.
SANTA ANITA HUILLOAC, A.
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

AUTORIZÓ
ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS



AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
11/01/2024-2027

1740



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y

CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

4. CROQUIS


CONCEPTO: CORTE DE PAVIMENTO DE ASFALTO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 10 CM. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA

PRE-4-1

CONCEPTO:

CLAVE:

CALLE ALVARO OBREGON (VIA)

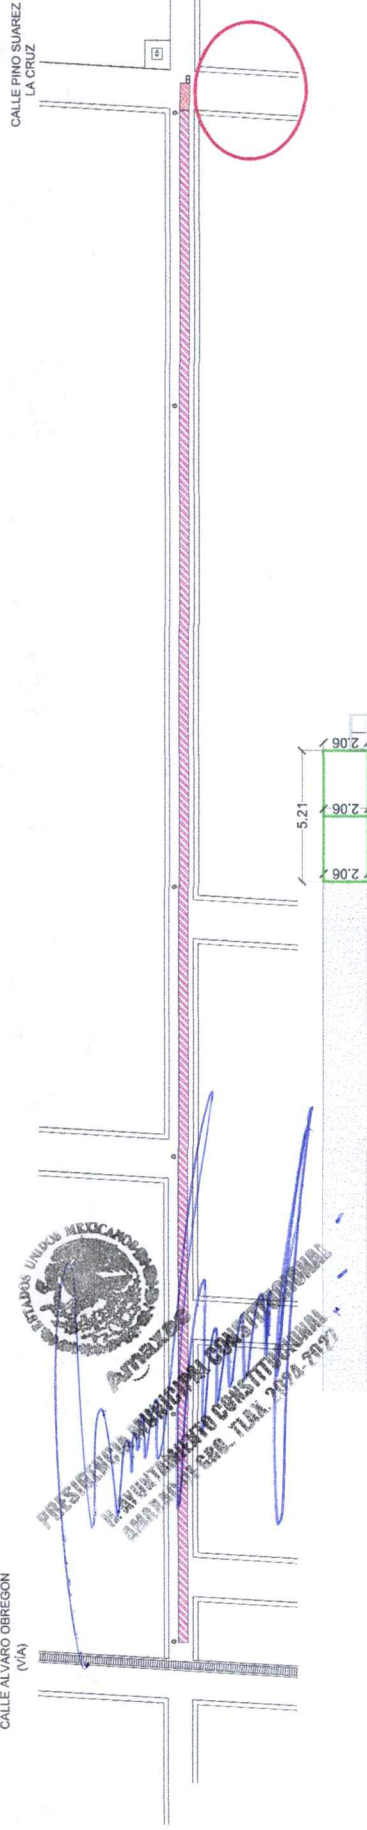

CARPETA ASFALTICA

OPERADO FISM


CORTE EN CARPETA ASFALTICA



Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
R.F.C. APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO
C.P. 90407

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



AUTORIZÓ

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS
AL AGUARDAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERO. TLAX. 2024-2027



AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
AL AGUARDAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERO. TLAX. 2024-2027



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC1611111S8

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTECATL
PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTECATL
ALVARO OBREGÓN Y PINO SUÁREZ
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

4. CROQUIS


DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 A 15 CM. POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO

PRE-6-1

CONCEPTO:

CALLE ALVARO OBREGON
(V/A)

CALLE PINO SUAREZ
LA CRUZ

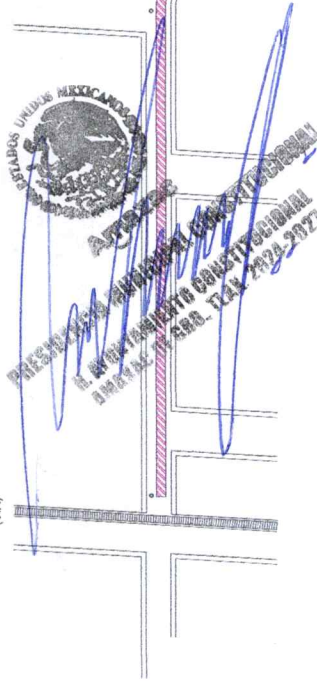

288.00

CONCRETO HIDRAULICO

CARPETA ASFALTICA



DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
R.F.C. APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, AP
C.P. 95407
Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



AUTORIZO
ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
ALVARO OBREGON, TLAXCALA, 2024-2027



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC1611111S8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLE: XICHOHTENCATL
ENTRE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUÁREZ
MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

4. CROQUIS

DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE HASTA 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PRE-4.1

CONCEPTO:

CALLE ALVARO OBREGON (V/A)

CALLE PINO SUAREZ LA CRUZ



CARPETA ASFALTICA

OPERADO
FISM

DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA

armah
Armah Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
R.F.C. APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, AP
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com



REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

AUTORIZÓ
ARQ. CAROLINA VAZQUEZ COBARRA-2024-2027
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
1743



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILLOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

OBRA:

CONSISTENTE EN:

CALLE:

ENTRE:

MUNICIPIO:

CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALIMENTACION DE
AGUA POTABLE EN CALLE XICHTENCATL
PRELIMINARES. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. RED DE
ALIMENTACION DE AGUA POTABLE. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
XICHTENCATL
ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACION 01 (UNO)

4. CROQUIS

EXCAVACION EN CEPAL CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.

TERR-3

CONCEPTO:

CLAVE:

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION

CALLE PINO SUAREZ

ADICION

CARPETA ASFALTICA

CARPETA ASFALTICA

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30

1.30

1.52

2.06

5.21

1.60

2.06

1.52

1.30



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTECATL

CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

CALLE: XICOHTECATL

ENTRE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUÁREZ

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO: FISM 2501/003-01

IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025

PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025

NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)


4. CROQUIS

CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PRE-11

CONCEPTO:

CLAVE:

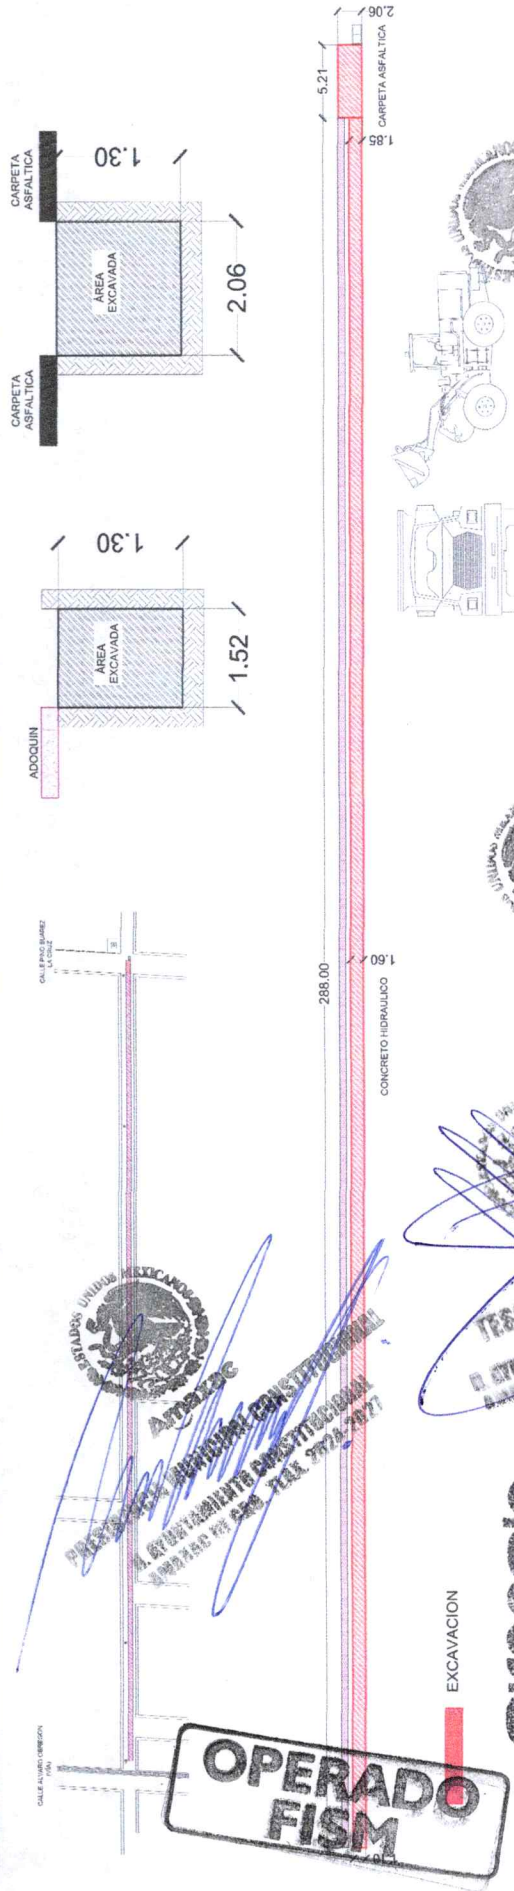

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.

R.F.C. APC1611111S8

CALLE SIN NOMBRE 109-10 47

SANTA ANITA HUILOAC, A.

C.P. 90407

REALIZÓ

CARLOS MANUEL OBREGÓN HERNÁNDEZ

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

AUTORIZO

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA

SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES


ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

PROYECTO DE AGUAS POTABLES

ESTADO DE GUERRERO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO



**ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC161111S8

CONTRATO:	FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRA
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 13 DE MAYO
NO. DE ESTIMACION	01 (UNO)

4. CROQUIS

COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T

TERR-7-1

CONCEPTO:

CLAVE:

CALLE ALVARO OBREGON
(1A)

CALLE PINO SUAREZ
LA CRUZ

[illegible]

OPERADO FISM

COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL

288 00-

1

Armah Proyectos y Construcción S. de RL
RFC: APC100111158
CALLE SIN NOMBRE 109-10 412 50000
SANTA ANITA HUILLOAC, A.C.

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
C.P. 95407
CONSTR. INZ. CARLOS DIAZ HERNANDEZ S. DE C.V.
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE C.V.

AUTORIZÓ
ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

1-800-441-2277

1746



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM


OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE:	
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:	FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

CLAVE:	PRE-1	CONCEPTO:
--------	-------	-----------

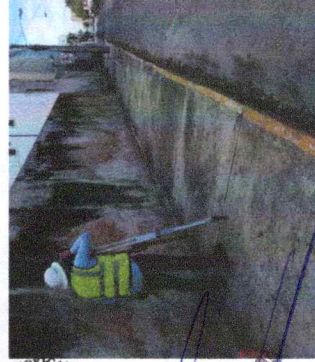

OPERADO
FISM

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
RFC: APC1611111S8

CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 90407

Correo: 2022armah@gm.


REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE APIZACO
ESTADO DE OAX. 11/01/2024-2027

TESORO MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE APIZACO
ESTADO DE OAX. 11/01/2024-2027



AUTORIZÓ CONSTRUCCION
ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS



1748

AUTORIZÓ
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.

CLAVE:

PRE-1

CONCEPTO:

OPERADO
FISM



armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
RFC: APC1611111S8

CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

1743



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC1611111S

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CORTE DE PAVIMENTO DE ASFALTO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 10 CM. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA

CLAVE: PRE-4-1 CONCEPTO:



OPERADO
FISM

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com



11750
e.
AUTORIZACION
2024-2027

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

AUTORIZACION
2024-2027
CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTOR
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHOHTECATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICHOHTECATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CORTE DE PAVIMENTO DE ASFALTO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 10 CM. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA

CLAVE: PRE-4-1

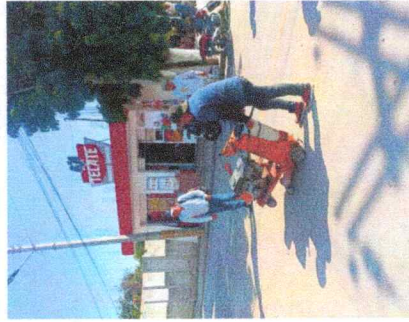

OPERADO
FISM

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 90407
CORREO: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



1751

AUTORIZÓ
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ARO. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

R.F.C. APC1611111S8


5. REPORTE FOTOGRÁFICO

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 A 15 CM. POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO

PRE-6-1

CONCEPTO:

CLAVE:

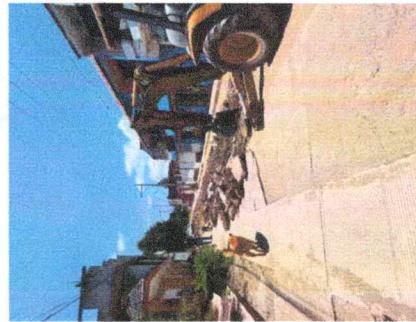


OPERADO
FISM

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



1752



AUTORIZO

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZO

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICHOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 A 15 CM. POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO

PRE-6-1

CONCEPTO:

CLAVE:



OPERADO
FISM

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 62407
Correo: 2022armah@gmail.com



REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

R.F.C. APC1611111S8

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE HASTA 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CLAVE:

PRE-4.1

CONCEPTO:



Armah Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, A.P. 680407
Correo: 2022armah@gmail.com



REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE HASTA 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PRE-4.1


CONCEPTO:

CLAVE:



armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10-11
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 39407
Correo: 2022armah@gmail.com



1755

ARMAR
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PERIODO DE GOB. 2024-2027

AUTORIZÓ
ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

REALIZÓ
CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

AUTORIZÓ
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

R.F.C. APC1611111S8

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.

TERR-3

CLAVE:



OPERADO
FISM

armah

Arman Proyectos y Construcción S.

RFC: APC1611111S8

CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA

SANTA ANITA HUILOAC, A.


C.P. 90407

Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



1756

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

REALIZÓ

ARG. CAROLINA VAZQUEZ CORREA

SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZA

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICHOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACION 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

EXCAVACION EN CEPA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.

TERR-3

CONCEPTO:

CLAVE:



OPERADO
FISM

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.

RFC: APC161111S8

CALLE SIN NOMBRE 109-10

SANTA ANITA HUILOAC

APIZACO, PUEBLA

Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



1757

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CLAVE:

PRE-11

CONCEPTO:



OPERADO
FISM



armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
RFC: APC1611111S8

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10
SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO
C.P. 90407

Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



AUTORIZÓ

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS



AUTORIZÓ

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

1758

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICHOHTENCATL
CALLE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE:	
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:	FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 08 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)


5. REPORTE FOTOGRÁFICO

CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

CLAVE:

PRE-11

CONCEPTO:

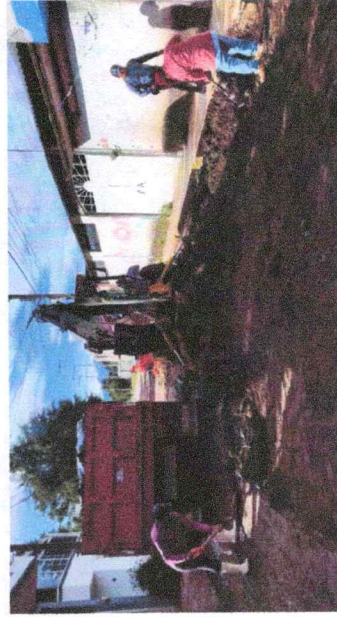




armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 56407
Correo: 2022armah@gmail.com

OPERADO FISM

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAY 2024-2027

AUTORIZO


ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAY 2024-2027

AUTORIZO

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MAY 2024-2027

AUTORIZO

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)




5. REPORTE FOTOGRÁFICO

COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T

CLAVE:

TERR-7-1

CONCEPTO:

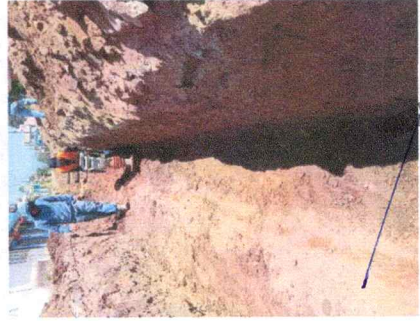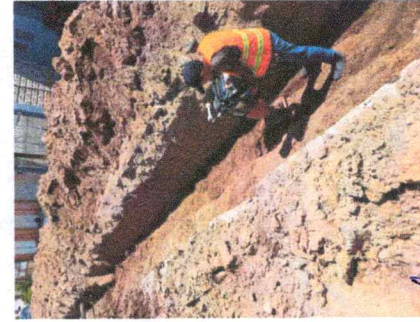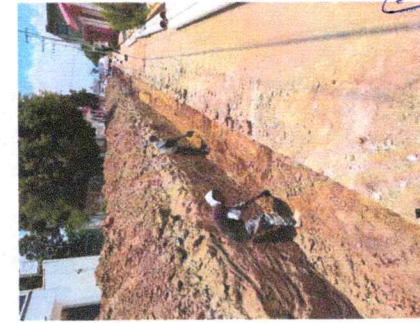

OPERADO
FISM

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de C.V.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, A.P.
C.P. 900607
Correo: 2022armah@gmail.com



REALIZÓ
CARLOS MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

AUTORIZÓ
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

1760



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

R.F.C. APC1611111S8

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICOHTENCATL
CALLE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE:	
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:	FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN	01 (UNO)


5. REPORTE FOTOGRÁFICO

COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T

TERR-7-1

CONCEPTO:

CLAVE:

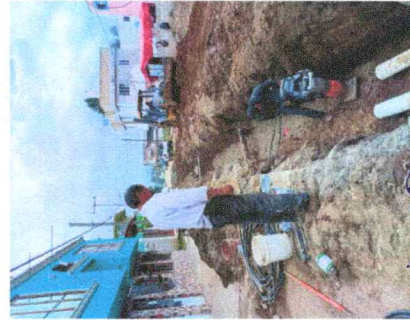

OPERADO
FISM

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
RFC: APC161111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 96407
Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ
CARLOS MANUEL DÍAZ HERNÁNDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.



1761

AUTORIZÓ
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

PROYECTOS & CONSTRUCCION

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA:	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICHOHTENCATL
CALLE:	ALVARO OBREGON Y PINO SUAREZ
ENTRE:	
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONTRATO:	FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO	\$1,098,234.00
PROGRAMA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO	DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 09 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACION:	DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACION	01 (UNO)

5. REPORTE FOTOGRAFICO

SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE DIAMETRO 6" (15 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRAULICAS.



CLAVE: APOT-009-1 CONCEPTO:



OPERADO
FISM

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L. de C.V.
RFC: APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, A.
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com



REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

AUTORIZÓ

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

1762



ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

APC1611111S8

ARMAH PROYECTOS Y
CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

CALLE SIN NOMBRE 4TA SECCION No. 109-10

SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO

PROYECTOS & CONSTRUCCIÓN

R.F.C. APC1611111S8

TEL. 55-17-59-43-52 CORREO: 2022ARMAH@GMAIL.COM

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHOHTENCATL
CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO XICHOHTENCATL
CALLE: ALVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
ENTRE: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
MUNICIPIO:

CONTRATO: FISM 2501/003-01
IMPORTE DEL CONTRATADO \$1,098,234.00
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 13 DE MAYO DE 2025 AL 08 DE JUNIO DE 2025
PERIODO DE ESTIMACIÓN: DEL 13 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2025
NO. DE ESTIMACIÓN 01 (UNO)


5. REPORTE FOTOGRÁFICO

SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE DIAMETRO 6" (15 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRAULICAS.

CLAVE: APOT-009-1 CONCEPTO:



OPERADO
FISM

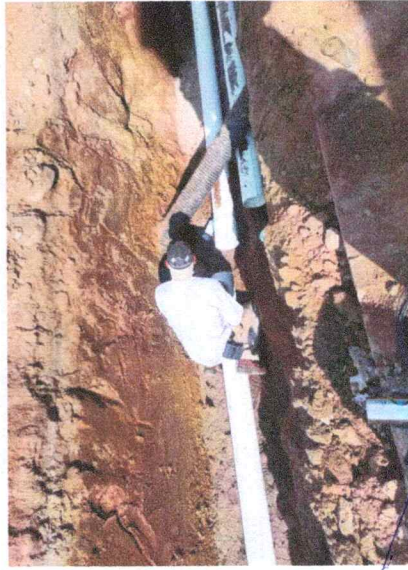

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de R.L.
R.F.C. APC1611111S8
CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, APIZACO
C.P. 90467
Correo: 2022armah@gmail.com

REALIZÓ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL

AUTORIZO
ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO Y DESARROLLO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE AGUA Y SANEAMIENTO
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL

AUTORIZO
ING. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

CUMPLIMIENTO DE OBRA
CNSF-F0025-0005-2023

NÚMERO DE FIANZA	FECHA DE EXPEDICIÓN	MONTO DE FIANZA	MONTO DE MOVIMIENTO
BKY-0465-0255764	12/05/2025	109,823.40	109,823.40

Berkley International Compañía de Garantías México, S.A. de C.V., en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye fiadora hasta por la suma de:

\$ 109,823.40 (**CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 MN**)

BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MEXICO, S.A. DE C.V., SE CONSTITUYE FIADORA POR LA CANTIDAD DE \$109,823.40 (CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 40/100 M.N.).-

A FAVOR DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

PARA GARANTIZAR POR ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NÚMERO FISM2501/003-01 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025, CON UN IMPORTE DE \$1,098,234.00 (UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHTENCALT, CONSISTENTE EN PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE XICHTENCALT, ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUÁREZ, MUNICIPIO AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA. META PROGRAMADA 578.00 ML.. LA VIGENCIA DE LA FIANZA EMPIEZA A SURTIR EFECTOS A PARTIR DEL 12 DE MAYO DE 2025.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO B) SE CANCELARA UNA VEZ QUE LA AFIANZADORA RECIBA UN COMUNICADO ESCRITO POR EL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX, C) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, D) LA FIANZA SE EXPIDE EN TERMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. E).- LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 291 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN EN EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA SE ACREDITARA ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACION LOS DOCUMENTOS QUE COMPROBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION GARANTIZADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR, LA INSTITUCION TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACION O DOCUMENTACION QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACION EN TERMINOS DEL MISMO NUMERAL. *** FIN DE TEXTO ***

LINEA DE VALIDACIÓN: LINEA DE VALIDACIÓN: B2557640000K60450000001Y

MARIANA FUENTES RUIZ

SUBDIRECTOR COMERCIAL

SELLO DIGITAL: auPoiGQDV6bqGMN79MYBMvi0pjZhHgCA4lJqXe5Co9Sw7Vo8Jw1Tzg7C0tzXprJaGDq2Mjk9vRiVF0J/IZOQMFOCGvUikdJnKKSmoHP
xMYznpiHToKDAcIt6kC85N7+0v7BWx3myUOSjDrzQXJT9xIBcuxyKw1hoOfplyAyhnt
+aKsLiTEXTAS0UsLWheDm6MFSRJSGZ6GeDHg8TH3ROVLAn/mCi+YZxf/a6ed8tPIFmUr3r0sBYRK2VH
+Fu7HLYMXUE6wi6xFSEzTWxMI21/n0J9er/79Rjh+7AP/wUwSAigBF452vk+A0Fb0YI3eEZWvt1oxl1MEI6CSg==

De conformidad con lo establecido dentro del artículo 214 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la afianzadora podrá utilizar medios electrónicos para pactar operaciones y prestación de servicios de la misma y el uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la firma autógrafa producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Autorizado por la CNSF mediante oficio No. 06-C00-22100/24502, de fecha 29 de Mayo del 2017
BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MEXICO, S.A. DE C.V.: Corporativo Zentrum, Avenida Santa Fe 495, Piso 19 Oficina 1904, Cruz Manca
Cuajimalpa de Morelos, CP 05349, CDMX México.

**OPERADO
FISM**

NORMAS REGULADORAS PARA PÓLIZAS DE FIANZA DEL RAMO III

- 1.- En toda póliza otorgada por la Afianzadora, sus derechos y obligaciones se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por la LISF, se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal. (Art. 183 LISF); la póliza será numerada al igual que sus endosos debiendo contener, en su caso, indicaciones que administrativamente fijen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en adelante SHCP y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en adelante CNSF (Art. 166 LISF).
- 2.- En caso de PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA PÓLIZA DE FIANZA al ejercitar su derecho de reclamación de la fianza, EL BENEFICIARIO deberá comprobar por escrito que la póliza le fue otorgada, solicitando a la AFIANZADORA un duplicado de la póliza emitida a su favor. (Art. 166 LISF).
- 3.- Se presume la extinción de obligación como fiadora cuando se hace la devolución de una póliza a la AFIANZADORA, salvo prueba en contrario. (Art. 166 LISF).
- 4.- Las fianzas y los contratos, que en relación a la póliza de fianza se otorguen o se celebren serán mercantiles para todas las partes que intervengan, ya sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES, FIADAS, CONTRAFIADORAS U OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo la garantía hipotecaria. (Art. 32 LISF).
- 5.- La fianza suscrita en este folio será nula o sin efectos legales si se garantizan operaciones de crédito, aun cuando en el texto de la misma se señale lo contrario, está póliza no garantiza el pago de títulos de crédito como letras de cambio y pagarés, ni el pago de préstamos que deberán solventarse en dinero. Esta fianza no surtirá efectos si se garantizan préstamos de dinero, mutuos, financiamientos en numerario o en especie, reestructuras de adeudos, negociaciones de pasivos y cualquier otra operación no autorizada por la SHCP.
- 6.- La AFIANZADORA no gozará de los beneficios de orden y excusión y deberá ser regida en los términos que establece la LISF. (Art. 178 LISF).
- 7.- La obligación de la AFIANZADORA quedará sin efectos: 7.1 Si el BENEFICIARIO concede al FIADO, prórroga o espera para el cumplimiento de la obligación afianzada sin el consentimiento previo y por escrito de la AFIANZADORA (Art. 179 LISF). 7.2 La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza, si la AFIANZADORA no da su consentimiento previo y por escrito para esa novación y para garantizar con la fianza la obligación novatoria (Arts. 2220 y 2221 del Código Civil Federal en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligación afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa la obligación principal afianzada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones (Art. 2847 del CCF). La AFIANZADORA tendrá derecho, a oponer todas las excepciones que le sean inherentes a la obligación principal, incluyendo todas las causas de liberación de la fianza. 7.4 Si en la póliza de fianza no se establece plazo de caducidad se estará a lo señalado en el Art. 174 LISF y caducará el derecho del BENEFICIARIO, para reclamar si la fianza no se reclama dentro del plazo señalado para tal efecto. 7.5 Prescribirá la obligación de la AFIANZADORA una vez transcurrido el plazo para que se prescriba la obligación principal garantizada o el de 3 años lo que resulte menor (Art. 175 LISF), para interrumpir la prescripción deberá requerirse por escrito a la AFIANZADORA, en los términos del Art. 175 LISF.
- 8.- Para reclamar la fianza: 8.1 El BENEFICIARIO deberá presentar la reclamación directamente y por escrito, en el domicilio de la AFIANZADORA, en algunas de sus sucursales u oficinas de servicios, con la firma del BENEFICIARIO o de su APODERADO O REPRESENTANTE, acreditando la personalidad con la que se ostenta y señalando: fecha de reclamación, número de póliza de fianza relacionada con la reclamación que se fórmula, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del FIADO, nombre o denominación del BENEFICIARIO y en su caso de su Representante legal debidamente acreditado, domicilio del BENEFICIARIO para oír y recibir notificaciones descripción de la obligación garantizada, acompañando copia de la documentación con la que se basó la expedición de la fianza, referencia del contrato o documento fuente (fecha, número, etc.). Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación debiendo acompañar la documentación que sirve como soporte para comprobar lo declarado y el importe reclamado como suerte principal, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza. /Circula Única de Seguros y Fianzas, en adelante CUSF, Disposición 4.2.8, Fracc. VIII y Art. 279 1er Párrafo Fracc. I LISF). 8.2 Si la fianza garantiza obligaciones fiscales federales se apegará al Art. 143, del Código Fiscal de la Federación. 8.3 Las fianzas expedidas ante la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios se hará efectiva a elección del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento señalado en los Arts. 279 o 282 LISF y en su reglamento. 8.4 Fianzas otorgadas ante autoridades judiciales, no penales, se harán efectivas, a elección del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts. 279 y 280 LISF o por la vía de incidente en el juicio en el que se hubieran otorgado (Código Federal de Procedimientos Civiles, Art. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas conforme al Art. 282 LISF. Para la presentación del FIADO, se le requerirá personalmente o por correo certificado, con acuse de recibo a la AFIANZADORA en sus oficinas principales o en el domicilio del Aportado designado para ello, procediendo a la aplicación del Art. 291 LISF, en caso de la no presentación del FIADO en el plazo concedido. 8.6 Cuando la AFIANZADORA reciba la reclamación de la fianza, podrá hacerlo del conocimiento del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, haciéndole saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianzas o en los procedimientos convencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que presenten oportunamente los elementos y documentación necesaria para informarse en contra de la reclamación, y que exprese lo que a su derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos deudores juicio que en su contra promoviere el BENEFICIARIO para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede a las resultas del juicio, si se condenará a la AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF). 8.7 Una vez integrada la reclamación en los términos de los Arts. 279 o 282 LISF, la AFIANZADORA tendrá un plazo hasta de 30 días naturales contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al BENEFICIARIO, las razones, causas o motivos de su improcedencia. 8.8 Si la AFIANZADORA no recibe la reclamación estado el FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO O CONTRAFIADOR, obligando a rembolsar a la AFIANZADORA lo que a ésta le corresponda, sin que pueda oponer a la AFIANZADORA las excepciones que el FIADO tuviera frente su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no será aplicable en ningún caso los Arts. 2832 y 2833 del CCF (Art. 289 LISF). Sin embargo, el FIADO conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la importancia del pago hecho por la AFIANZADORA. La AFIANZADORA, al ser requerida o demandada podrá denunciar el pleito al deudor principal para que aporte pruebas en contra de la reclamación de la fianza y quede ala resulta del juicio, para el caso de que llegará a condenar a la AFIANZADORA al pago (Art. 289 LISF y 2823 del CCF).
- 9.- En caso de que la AFIANZADORA rechazaré la reclamación o no diera contestación en los plazos establecidos por la ley; el BENEFICIARIO podrá elegir, en la reclamación de su pago, el procedimiento señalado en el Art. 280 LISF o el 50 bis y 68 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
- 10.- OTRAS DISPOSICIONES. Existe obligación de las oficinas y autoridades dependientes de la Federación, Distrito Federal, de los Estados y Municipios, de proporcionar a la AFIANZADORA los datos sobre la situación del asunto, ya sea, judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza para el que se haya otorgado la fianza. 10.1 La AFIANZADORA se considera de acreditada solvencia Art. 16 Párrafo 1o. LISF y Art. 18 1er Párrafo LISF. 10.2 Si la AFIANZADORA no cumple con la obligación garantizada en la póliza dentro de los plazos legales para su cumplimiento, deberá cubrir al acreedor indemnización por mora conforme al Art. 283 LISF. 10.3 Ninguna autoridad podrá fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS, que el señalado para las pólizas en efectivo u otras formas en garantías. La infracción de este precepto será causa de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones garantizadas son de hacer o de dar, la AFIANZADORA podrá sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación. En las fianzas en las que se garantice el pago de una suma de dinero en parcialidades la falta de pago de algunas de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza por la totalidad, (ART. 176 LISF). 10.4 El pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga a la AFIANZADORA, por ministerio de la ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada. La AFIANZADORA podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones si por causas imputables al BENEFICIARIO del póliza de fianzas, el pago es impedido o le resulta imposible la subrogación. (Art. 177 LISF y 2830 y 2845 del CCF).
- 11.- FIANZAS EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en moneda extranjera, LA AFIANZADORA, EL BENEFICIARIO, EL FIADO Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS se someten al Art. 173 LISF y capítulo 19.2 CUSF. Únicamente se podrán autorizar este tipo de operaciones cuando se relacionen con el cumplimiento de obligaciones exigibles fuera del país o que por la naturaleza de dichas obligaciones se justifique que su pago se convenga en moneda extranjera. RECLAMACIÓN.- Que el pago de la reclamación procedente por fianza expedida en moneda extranjera y que deba realizarse en el extranjero se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el país donde debió cumplirse la obligación afianzada y en la moneda que se haya establecido en la póliza (Disposición 19.2.3, Fracc. II, CUSF).
- PRIMAS.- Las primas relacionadas con la expedición de fianzas se pagarán anualmente a "LA AFIANZADORA" por los medios que esta designe para el pago de las primas, derechos, impuesto al valor agregado y gastos de administración (los relativos a la suscripción, emisión, aumentos, prórrogas, cobranza, control y cualquier otra función necesaria para el manejo operativo de las fianzas), más cualesquiera otros derechos o impuestos que establecieren las leyes aplicables a su cargo.
- CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resolver las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere la presente, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos LISF, de la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales (Disposición 19.2.3, Fracc. III CUSF).
- 12.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- EL (LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O EL (LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualquier otros obligados, en su caso así como tratándose de BENEFICIARIOS PARTICULARES, para efectos de interpretación, cumplimiento y ejecución de esta póliza, se someten de forma expresa a la jurisdicción u competencia de los Tribunales Federales o del fuero común del Distrito Federal, y/o Guadalajara, Jalisco a elección de la parte autora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecindad; aplicándose en todo caso la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y su legislación supletoria. Las fianzas a favor de la Federación, Distrito federal, estados y Municipios, se harán efectivas en los términos del Art. 282 LISF.
- 13.- USO DE EQUIPO, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS O DE CUALQUIER OTRA TECNOLOGÍA.- De conformidad en los previstos en los Arts 165 y 214 LISF las partes pactan que la AFIANZADORA podrá usar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología en la celebración de sus operaciones y prestación de servicios incluyendo la expedición electrónica o digital de sus pólizas de fianzas así como de sus documentos modificatorios, por lo que el uso de la firma digital resultado de utilizar Firma Electrónica sobre una fianza electrónica sustituye a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes con el mismo valor probatorio; por tal motivo EL (LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO SOLIDARIO(S) expresa (n) su consentimiento para que LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, emita las fianzas y los movimientos modificatorios, en forma escrita o a través de medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología válida y no podrá objetar el uso de estos medios u oponerse a los mismos, por lo que la interpretación y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por el Título Segundo del Comercio Electrónico, Libro Segundo del Código de Comercio Vigente Art. 89 al 114 ejemplo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio, pactando al efecto.
- 14.- Que a través de estos medios se podrán emitir los recibos del cobro de primas, notas de crédito, emisión de pólizas de fianzas, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados a la Afianzadora, así como, cualquier otro derivado de la prestación del servicio contratado, documentos electrónicos que podrán imprimirse en papel pero que será la versión electrónica la que prevalezca si eventualmente existiera alguna diferencia entre ambas.
- 15.- Que al fin de establecer que la fianza electrónica fue generada por LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, en términos del Art. 90 bis del Código de Comercio, las partes pactan como medio de identificación del usuario responsable de su uso, la validación de la póliza de fianza, a través de la constancia de consulta disponible en el portal de internet www.berkleymex.com.
- Los firmantes declaran conocer el contenido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la celebración de actos jurídicos mediante el uso de medios electrónicos o de cualquier otra tecnología por lo cual están dispuestos a operar a través de los mismos, ya que no le son ajenos. La Creación, Transmisión, Modificación y Extinción de Derechos y Obligaciones DERIVADOS DE LAS PÓLIZAS DE FIANZAS ELECTRÓNICAS SE SOPORTAN MEDIANTE UNA Firma Electrónica generada usando certificados digitales en términos del Título Segundo del Comercio Electrónico, Capítulo I, de los mensajes de datos, Art. 89-99 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S). De igual forma, los firmantes de este instrumento podrá(n) inherentes a las operaciones y servicios señalados en la Fracción I de esta cláusula. Así mismo, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA podrá solicitar y recibir documentación e información de los solicitantes mediante medios electrónicos siempre y cuando EL(LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADO(S) Y/O OBLIGADO(S) SOLIDARIOS(S) garantice (n) a satisfacción de LA COMPAÑÍA los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada.

armah

ARMAR PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV

RFC: APC161111158

Licitacion Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03

Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.

Descripción de la Obra: Demolicion de pavimento de concreto hidráulico, excavación de zanja, cama de arena para recibir tubería, suministro y colocación de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactación de zanja, pavimentación de concreto hidráulico previamente demolido.

Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Alvaro Obregón y Pino Suárez

Localidad: Amaxac de Guerrero

Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.

Meta Programada: 578.00 ml

Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025

Fecha de Terminio de los Trabajos: 09 de junio de 2025

Plazo de Ejecución: 28 Días Naturales



ANEXO PE-11 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS DE MANERA QUINCENAL

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
A	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL	1.00		946,753.45	13/05/2025	09/06/2025				
PRE-1	PRELIMINARES	1.00		92,965.37	13/05/2025	22/05/2025	\$5,456.20 100.00%			\$5,456.20 100.00%
	TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	322.09	M2	5,456.20	13/05/2025	13/05/2025				
PRE-3-1	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 A 15 CM. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	293.50	ML	15,402.88	13/05/2025	17/05/2025	\$10,268.24 66.66%	\$5,134.64 33.34%		\$15,402.88 100.00%
PRE-4-1	CORTE DE PAVIMENTO DE ASFALTO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 10 CM. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	12.15	ML	749.05	13/05/2025	13/05/2025	\$749.05 100.00%			\$749.05 100.00%


Armar Proyectos y Construcción S de RL de CV

LIC. CARLOS MANUEL HERNANDEZ

CALLE SIN NOMBRAR 22-11-21

SABRES EN ANTE LEGAL

Corre: 022armc@pro.com



OTORGADO
FISM

Dirección: SIN NOMBRAR 109-301, STA. ANA, HUILOAC, TLAXCALA, C.P. 90407
Contacto: 2022armc@gmail.com

1672

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03
Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.
Descripción de la Obra: Demolicion de pavimento de concreto hidráulico, excavacion de zanja, cama de arena para recibir tubería, suministro y colocacion de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactacion de zanja, pavimentacion de concreto hidráulico previamente demolido.
Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Alvaro Obregón y Pino Suárez
Localidad: Amaxac de Guerrero
Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.
Meta Programada: 578.00 ml
Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025
Fecha de Terminio de los Trabajos: 09 de junio de 2025
Plazo de Ejecucion: 28 Dias Naturales.

ANEXO PE-11 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS DE MANERA QUINCENAL

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
PRE-6-1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 A 15 CM. POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO	199.50	M2	13,081.22	13/05/2025	17/05/2025	\$8,720.15 66.66%	\$4,361.07 33.34%		\$13,081.22 100.00%
PRE-4-1	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	8.51	M2	603.78	13/05/2025	13/05/2025	\$603.78 100.00%			\$603.78 100.00%
ADOQ-04	RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOQUINADO EXISTENTE SOBRE CAMA DE ARENA POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACION DE MATERIAL. INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, APILADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	114.00	M2	4,653.48	15/05/2025	20/05/2025	\$1,033.97 22.22%	\$3,619.51 77.78%		\$4,653.48 100.00%
TERR-3	EXCAVACION EN CEGA CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	418.57	M3	38,094.06	17/05/2025	22/05/2025		\$38,094.06 100.00%		\$38,094.06 100.00%
PRE-11	CARGA Y CARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DESPALMEO, DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	67.74	M3	4,924.70	17/05/2025	22/05/2025		\$4,924.70 100.00%		\$4,924.70 100.00%
B		1.00		510,325.92	19/05/2025	31/05/2025				

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

\$10,357.90
\$26,831.39

\$50,995.34
\$56,133.98

\$0.00
\$0.00

LIC. CARLOS MANUEL DÍAZ HERNANDEZ
Armar Proyectos y Construcción S de RL de CV
REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE 109, 10 41
SANTA ANA, TLAHUACALPAN
C.P. 92467

Correo: 2022armar@armah.com.mx

1673

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

**OPERADO
FISM**

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE TLAHUACALPAN
C.P. 92467
Teléfono: 01 924 67 4362

Dirección:
HUILOAC, TLAHUACALPAN, C.P. 92467
Contacto: 2022armar@armah.com.mx

Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03
Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.
Descripción de la Obra: Demolicion de pavimento de concreto hidraulico, excavacion de zanja, cama de arena para recibir tubería, suministro y colocación de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactación de zanja, pavimentación de concreto hidraulico previamente demolido.
Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Alvaro Obregon y Pino Suarez
Localidad: Amaxac de Guerrero
Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.
Meta Programada: 578.00 ml
Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025
Fecha de Término de los Trabajos: 09 de junio de 2025
Plazo de Ejecución: 28 Días Naturales.

ANEXO PE-11 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS DE MANERA QUINCENAL

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
TERR-7-1	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y SUMINISTROS P.U.O. E	322.09	M2	10,670.84	19/05/2025	28/05/2025		\$10,670.84 100.00%		\$10,670.84 100.00%
APOT-000	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TENDIDO DE TUBERÍA PARA AGUA POTABLE, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTROS DE ARENA, MANO DE OBRA, ACARREO Y VASADO EN CARRETILLA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	322.09	M2	17,618.32	19/05/2025	28/05/2025		\$17,618.32 100.00%		\$17,618.32 100.00%
APOT-009-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC CED. 40 DE DIÁMETRO 6" (15 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTAS	578.00	ML	300,947.26	19/05/2025	30/05/2025		\$300,947.26 100.00%		\$300,947.26 100.00%
APOT-008-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TUBO HIDRÁULICO DE PVC HIDRÁULICO CED. 40 DE DIÁMETRO 1 1/2" (3.8 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HERRAMIENTAS	3.50	ML	1,087.87	19/05/2025	19/05/2025		\$1,087.87 100.00%		\$1,087.87 100.00%
APOT-38-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE TAPON CAMPANA HIDRÁULICO DE PVC CED. 40 DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA	421.42	29/05/2025	29/05/2025		\$421.42 100.00%		\$421.42 100.00%

Suma en la hoja: \$0.00
Suma acumulada: \$26,831.39

\$330,745.71
\$386,879.69

\$0.00
\$0.00

Armar Proyectos y Construcción S. de RL de CV
LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

CALE SIN NOTARÍA
REPRESENTANTE LEGAL
SAN JUAN, OAXACA
C.P. 91403

COB. 2022 gmo. 2022

Dirección: SIN NOTARÍA
HUILLOAC, TLAXCALA
Contacto: 2022arma

9,4562

CONSTITUCIONAL
2022-2027

1674

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

armah

ARMAS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV

RFC: APC161111158

Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03
Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.
Descripción de la Obra: Demolicion de pavimento de concreto hidraulico, excavacion de zanja, cama de arena para recibir tubería, suministro y colocacion de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactacion de zanja, pavimentación de concreto hidraulico previamente demolido.

Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Alvaro Obregon y Pino Suarez

Localidad: Amaxac de Guerrero

Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala

Meta Programada: 28.00 m

Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025

Fecha de Término de los Trabajos: 19 de junio de 2025

Plazo de Ejecución: 28 Días Naturales



ANEXO PE-11 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS DE MANERA QUINCENAL

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
APOT-043-2	SUMINISTRO Y CONEXION DE TEE PVC CED 40 CEMENTAR 64 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	3.00	PZA	1,052.22	29/05/2025	29/05/2025		\$1,052.22 100.00%		\$1,052.22 100.00%
APOT-045-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE COPLE HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	PZA	319.35	29/05/2025	29/05/2025		\$319.35 100.00%		\$319.35 100.00%
APOT-048-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE COPLE HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	2.00	PZA	820.54	29/05/2025	29/05/2025		\$820.54 100.00%		\$820.54 100.00%
APOT-017-2	SUMINISTRO Y CONEXION DE CODO HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 45°X6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA	2,170.66	29/05/2025	29/05/2025		\$2,170.66 100.00%		\$2,170.66 100.00%
APOT-067-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE REDUCCION BUSHING HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6" A 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA	1,309.88	29/05/2025	29/05/2025		\$1,309.88 100.00%		\$1,309.88 100.00%
APOT-048-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE COPLE HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00	PZA	414.45	29/05/2025	29/05/2025		\$414.45 100.00%		\$414.45 100.00%
Suma en la hoja:							\$0.00	\$6,087.10	\$0.00	
Suma acumulada:							\$26,831.38	\$392,966.79	\$0.00	



armah

Armas Proyectos y Construcción S de RL de CV
LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

CALLE SIN NOMBRAR NO. 41
REPRESENTANTE LEGAL
SANIA ANTONIO GARCIA

Corrector: armah

1675



Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03

Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.

Descripción de la Obra: Demolición de pavimento de concreto hidráulico, excavación de zanja, cama de arena para recibir tubería, suministro y colocación de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactación de zanja, pavimentación de concreto hidráulico previamente demolido.

Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Alvaro Obregón y Pino Suárez

Localidad: Amaxac de Guerrero

Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.

Meta Programada: 578.00 ml

Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025

Fecha de Término de los Trabajos: 09 de junio de 2025

Plazo de Ejecución: 28 días naturales



ANEXO PE-11 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS DE MANERA QUINCENAL

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
APOT-075	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE YEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00	PZA	3,147.15	29/05/2025	29/05/2025		\$3,147.15 100.00%		\$3,147.15 100.00%
APOT-067-1	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6" A 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA	654.94	29/05/2025	29/05/2025		\$654.94 100.00%		\$654.94 100.00%
APOT-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 4", INCLUYE: TORNILLOS (5/8" x 3 1/2"), CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.00	PZA	18,851.92	30/05/2025	31/05/2025		\$18,851.92 100.00%		\$18,851.92 100.00%
APOT-004	CONEXIÓN DE TONIA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LÍNEA DE PVC CED. 40 DE 6", INCLUYE: HIDROTOMA DE 6" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 6", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO, EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	60.00	PZA	74,677.80	19/05/2025	28/05/2025		\$74,677.80 100.00%		\$74,677.80 100.00%
	RELLENO COMPACTADO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN CAPAS DE HASTA 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	295.45	M3	53,021.46	19/05/2025	30/05/2025		\$53,021.46 100.00%		\$53,021.46 100.00%

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

\$0.00
\$26,831.39

\$150,353.27
\$543,320.06

\$0.00
\$0.00

ARMAR PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV
LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
SANTA ANA, TLAVERA, TLAVERA
C.P. 90403

Correo: 2022armar@armar.com.mx

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HUILLO, ANITA

Contacto: 2022armar@armar.com.mx / 551 759 4352

OPERADO
FISM



2022

1676



ARMAR PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV

RFC: APC1611111S8

Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03
Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.
Descripción de la obra: Demolicion y de pavimento de concreto hidraulico, excavacion de zanja, cama de arena para recibir tubería, suministro y colocación de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactación de zanja, pavimentación de concreto hidráulico, previamente demolido.
Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Avaro Obregon y Pino Suarez
Localidad: Amatepec de Guerrero, Tlaxcala.
Municipio: Amatepec de Guerrero, Tlaxcala.
Meta Programada: 26 de mayo de 2025
Fecha Inicio de los Trabajos: 09 de junio de 2025
Plazo de Ejecución: 28 días Naturales.

ANEXO PE-11 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS DE MANERA QUINCENAL

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	15-may.-2025	01-jun.-2025	Total
APOT-030	SUMINISTRO Y CONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO DE 2 1/2", INCLUYE: EXTREMIDADES BRIDADAS DE ESPIGA Y CAMPANA EN PVC, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, VOLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	PZA	9,024.48	30/05/2025	30/05/2025		\$9,024.48 100.00%		\$9,024.48 100.00%
APOT-100	ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M, PARA TUBO DE 102 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	1.00	PZA	475.30	26/05/2025	26/05/2025		\$475.30 100.00%		\$475.30 100.00%
APOT-101	ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM2, DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M, PARA TUBO DE 152 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	1.00	PZA	403.80	26/05/2025	26/05/2025		\$403.80 100.00%		\$403.80 100.00%
APOT-026	REGISTRO HIDRAULICO DE 1.00 X1.00 M Y HASTA 1.50 CM DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, MARCO DOBLE Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 50X50 CM, INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, CAMA DE GRAVA DE 6 CM DE ESPESOR EN EL FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.00	PZA	13,236.26	30/05/2025	31/05/2025		\$13,236.26 100.00%		\$13,236.26 100.00%

Armar Proyectos y Construcciones S. de RL de CV
RFC: APC1611111S8
LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
SANTA AMITA, TLAHUAC
REPRESENTANTE LEGAL
Correos: carlosdiaz@armah.com.mx



Handwritten signatures and initials.

**ARMAR PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV**

RFC: APC16111115B

Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03
Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.
Descripción de la obra: Construcción de pavimento de concreto hidráulico, excavación de zanja, cama de arena para recibir tubería, suministro y colocación de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactación de zanja, pavimentación de concreto hidráulico previamente demolido.

Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Alvaro Obregón y Pino Suárez

Localidad: Anáhuac de Guerrero

Municipio: Amacuzac de Guerrero, Tlaxcala.

Meta Programada: 13.50 km

Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025

Fecha de Terminación de los Trabajos: 09 de junio de 2025

Plazo de Ejecución: 28 Días Naturales

ANEXO PE-11 PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS DE MANERA QUINCENAL

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
C	PAVIMENTACION	1.00		353,462.16	29/05/2025	09/06/2025				
CARR-015	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RR-2K EN RAZON DE 1.5 LTS/M2, APLICADO MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	8.51	M2	267.98	29/05/2025	29/05/2025	\$267.98 100.00%	\$267.98 100.00%		\$267.98 100.00%
CARR-2-1	CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA TEMPLADACON AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO, DE 6.00 CM DE ESPESOR, TENDIDO MANUAL Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	8.51	M2	2,370.12	29/05/2025	29/05/2025	\$2,370.12 100.00%	\$2,370.12 100.00%		\$2,370.12 100.00%
PAV-2.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE MR 30 PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, JUNTAS FRÍAS CON DISCO DE CORTE A CADA 3 METROS, RAYADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 6-6, ANTISOL BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	589.65	M2	350,824.06	30/05/2025	09/06/2025	\$65,773.93 18.75%	\$65,773.93 18.75%	\$285,050.13 81.25%	\$350,824.06 100.00%
Total parcial:							\$26,831.39	\$634,871.93	\$285,050.13	
Total acumulado:							\$26,831.39	\$661,703.32	\$946,753.45	
Porcentaje parcial:							2.83%	67.06%	30.11%	
Porcentaje acumulado:							2.83%	69.89%	100.00%	
Suma en la hoja:							\$0.00	\$68,412.03	\$285,050.13	
Suma acumulada:							\$26,831.39	\$634,871.93	\$285,050.13	

OPERAD FISM

amc

Armah Proyectos y Construcciones

armah

Armar Proyectos y Construcciones S de RL de CV
RFC: APC

LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

SEÑALANTE DE REPRESENTANTE LEGAL

Correo: 2025-05-13 15:52



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE FERIA Y EXPOSICIONES
SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ZONAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
SECRETARÍA DE ZONAS DE PROTECCIÓN CULTURAL
SECRETARÍA DE ZONAS DE PROTECCIÓN HISTÓRICA
SECRETARÍA DE ZONAS DE PROTECCIÓN PATRIMONIO
SECRETARÍA DE ZONAS DE PROTECCIÓN RECREATIVA
SECRETARÍA DE ZONAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE ZONAS DE PROTECCIÓN URBANA
SECRETARÍA DE ZONAS DE PROTECCIÓN VERDE
SECRETARÍA DE ZONAS DE PROTECCIÓN ZONAS DE PROTECCIÓN

OPERADO FISM

1678




ARMAR PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV

RFC: APC16111111S8

Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03
Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.
Descripción de la Obra: Demolicion de pavimento de concreto hidraulico, excavacion de zanja, cama de arena para recibir tuberia, suministro y colocacion de tuberia de agua potable, conexion de tomas domiciliarias, relleno y compactacion de zanja, pavimentacion de concreto hidraulico previamente demolido.
Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Alvaro Obregon y Pino Suarez
Localidad: Atlix, Puebla
Municipio: Atlix, Puebla
Meta Programada: 13 de mayo de 2025
Fecha Inicio de los Trabajos: 09 de junio de 2025
Plazo de Ejecución: 13 de mayo de 2025

ANEXO PT-11 PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHTENCATL									
A	PRELIMINARES	1.00		13/05/2025	09/06/2025	322.09	0	0	322.09
PRE-1	TRAZO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA CON ESTACADO Y TRAZO CON CAL, CADENAMIENTO CON PINTURA EN AEROSOL Y ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA	322.09	M2	13/05/2025	22/05/2025	322.09	0	0	322.09
PRE-3-1	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROFUNDIDAD DE 10 A 15 CM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	293.50	ML	13/05/2025	17/05/2025	195.66	97.84	0	293.50
PRE-4-1	CORTE DE PAVIMENTO DE ASFALTO HECHO CON CORTADORA CON UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 10 CM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE CON AGUA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREO DE MATERIAL DE CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA	12.15	ML	13/05/2025	13/05/2025	12.15	0	0	12.15

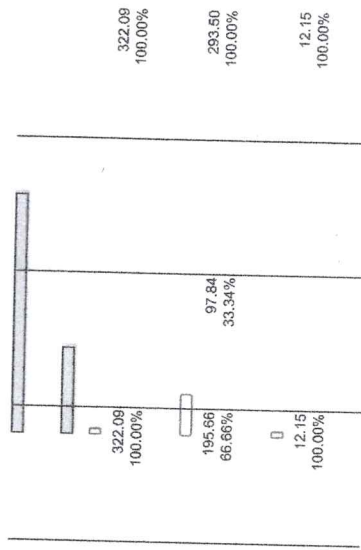

OPERADO
FISM

Armar Proyectos y Construcciones de RL de CV
RFC: APC16111111S8
LIC. CARLOS MANUEL OLIVERA MERNANDEZ
SANTA ANITA, PUEBLA, A.P.
REPRESENTANTE LEGAL
CONVOCA A LICITACION

SECRETARÍA DE GOBIERNO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE ENERGÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EXTERIORES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE TRABAJO
SECRETARÍA DE TURISMO
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE CULTURA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIO
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EXTERIORES
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

Handwritten signature and initials.

Licitación por invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03
Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.
Descripción de la Obra: Demolición de pavimento de concreto hidráulico, excavación de zanja, cama de arena para recibir tubería, suministro y colocación de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactación de zanja, pavimentación de concreto hidráulico permanentemente demolido.

Ubicación: Calle Xicohtencatl, colonia San José Obregon y Pino Suarez

Localidad: Amaten de Guerrero, Tlaxcala.

Municipio: Amaten de Guerrero, Tlaxcala.

Meta Programada: 09/06/2025

Fecha Inicio de los trabajos: 13 de mayo de 2025

Fecha de Término de los Trabajos: 09 de junio de 2025

Plazo de Ejecución: 26 días naturales.

ANEXO PT-11 PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
PRE-6-1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 A 15 CM. POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACAMELLONAMIENTO PARA SU POSTERIOR RETIRO	199.50	M2	13/05/2025	17/05/2025	132.99 66.68%	66.51 33.34%		199.50 100.00%
PRE-4-1	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE HASTA 10 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	8.51	M2	13/05/2025	13/05/2025	8.51 100.00%			8.51 100.00%
ADOQ-04	RETIRO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EXISTENTE SOBRE CAMA DE ARENA POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACION DEMATERIAL, INCLUYE: LIMPIEZA DE LAS PIEZAS, APLADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	114.00	M2	15/05/2025	20/05/2025	25.33 22.22%	88.67 77.78%		114.00 100.00%
TERR-3	EXCAVACION EN CEPÁ CON MEDIOS MECANICOS (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.50 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE TALUD Y FONDO Y MANIOBRAS LOCALES.	418.57	M3	17/05/2025	22/05/2025		418.57 100.00%		418.57 100.00%
PRE-11	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA HASTA 5 KM DE DISTANCIA, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	67.74	M3	17/05/2025	22/05/2025		67.74 100.00%		67.74 100.00%
	AGUA POTABLE	1.00		19/05/2025	31/05/2025				



LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
Amor Proyectos y Construcciones
REPRESENTANTE LEGAL
CALLE SIN NOMBRAR NO. 10 43
SAN JUAN DE LOS RIOS, Tlaxcala, P.C. 90407
Cofre: 2022armc



ARMAR PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV

REC: APC161111158

Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03
Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.
Descripción de la obra: Demolicion de pavimento de concreto hidraulico, excavacion de zanja, cama de arena para recibir tubería, suministro y colocacion de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactacion de zanja, pavimentación de concreto hidraulico y relleno de demolido.
Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Camino Obregon y Pino Suarez
Localidad: Amaxac de Guerrero
Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.
Meta Programada: 50% de obra
Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025
Fecha de Terminación de los Trabajos: 09 de junio de 2025
Plazo de Ejecución: 28 Días Naturales

ANEXO PT-11 PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha de Inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
TERR-7-1	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, INCORPORACIÓN DE AGUA PARA SU COMPACTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T	322.09	M2	19/05/2025	28/05/2025		322.09 100.00%		322.09 100.00%
APOT-000	CAMA DE ARENA EN CERA PARA TENDIDO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE, ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA A ORILLA DE OBRA, ACARREO Y VACIADO EN CARRETILLA HASTA 20 M, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	322.09	M2	19/05/2025	28/05/2025		322.09 100.00%		322.09 100.00%
APOT-009-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE DIAMETRO 6 (11.5 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRAULICAS.	578.00	ML	19/05/2025	30/05/2025		578.00 100.00%		578.00 100.00%
APOT-018	SUMINISTRO Y CONEXION DE TUBO HIDRAULICO DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE DIAMETRO 4" (10 CM), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS HIDRAULICAS.	3.50	ML	19/05/2025	19/05/2025		3.50 100.00%		3.50 100.00%
APOT-381	SUMINISTRO Y CONEXION DE TAPON CAMPANA HIDRAULICO DE PVC CED.40 DE 2 1/2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA	29/05/2025	29/05/2025		2.00 100.00%		2.00 100.00%



Armah Proyectos y Construcción S de RL de CV
LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ
CAJAL SIN NO. 000-100.16.41
REPRESENTANTE LEGAL
C.P. 95405
Código: 2024urmc-2024urmc-2024urmc

1681

Handwritten signatures and initials.

armah

ARMAS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN S DE RL DE CV

RFC: APC161111158

Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03

Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.

Descripción de la Obra: Demolicion de pavimento de concreto hidraulico, excavacion de zanja, cama de arena para recibir tuberia, suministro y colocacion de tuberia de agua potable, conexion de tomas domiciliarias, relleno y compactacion de zanja, pavimentacion de concreto hidraulico y finalmente demolido.

Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Victor Obregon y Pino Suarez

Localidad: Tlaxcala, Guerrero

Municipio: Tlaxcala, Guerrero, Tlaxcala.

Meta Programada: 8.00 m

Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025

Fecha de Terminación de los Trabajos: 09 de junio de 2025

Plazo de Ejecución: 28 días Naturales.

ANEXO PT-11 PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
APOT-043-2	SUMINISTRO Y CONEXION DE TEE PVC CED 40 CEMENTAR 64 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	3.00	PZA	29/05/2025	29/05/2025				3.00 100.00%
APOT-045-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE COPLE HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 2 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00	PZA	29/05/2025	29/05/2025				3.00 100.00%
APOT-048-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE COPLE HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	2.00	PZA	29/05/2025	29/05/2025				2.00 100.00%
APOT-017-2	SUMINISTRO Y CONEXION DE CODO HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 45°X6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA	29/05/2025	29/05/2025				2.00 100.00%
APOT-067-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE REDUCCION BUSHING HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6" A 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA	29/05/2025	29/05/2025				2.00 100.00%
APOT-048-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE COPLE HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00	PZA	29/05/2025	29/05/2025				1.00 100.00%

OPERADO
FISM

LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ, V

REPRESENTANTE LEGAL

CALLE SIN NOMBRE EN LA ZONA

SANITARIA, C.P. 90407

Corrección: 2025/05/29

1682

Licitacion Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03
Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.
Descripción de la obra: Demolicion de pavimento de concreto hidráulico, excavación de zanja, cana de arena para recibir tubería, suministro y colocación de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, relleno y compactación de zanja, pavimentación de concreto hidráulico previamente demolido.

Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Alvaro Obregón y Pino Suárez

Localidad: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.

Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.

Meta Programada: 578,00 m

Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2023

Fecha de Término de los Trabajos: 31 de mayo de 2023

Plazo de Ejecución: 28 Días

Plazo de Ejecución: 28 Días

ANEXO PT-11 PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
APOT-075	SUMINISTRO Y CONEXION DE YEE DE PVC HIDRAULICO CED. 40 DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA	29/05/2025	29/05/2025	1.00 100.00%	1.00 100.00%	1.00 100.00%
APOT-067-1	SUMINISTRO Y CONEXION DE REDUCCION BUSHING HIDRAULICO DE PVC CED. 40 DE 6" A 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA	29/05/2025	29/05/2025	1.00 100.00%	1.00 100.00%	1.00 100.00%
APOT-090	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA DE ACERO INOXIDABLE DE 4", INCLUYE: TORNILLOS (5/8" x 3 1/2"), CON CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.00	PZA	30/05/2025	31/05/2025	4.00 100.00%	4.00 100.00%	4.00 100.00%
APOT-004	CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN LINEA DE PVC CED. 40 DE 6", INCLUYE: HIDROTOMA DE 6" X 1/2", CONECTOR DE BRONCE DE 1/2", ABRAZADERAS SIN FIN DE 6", 3 M. DE POLIDUCTO DE 1/2" COLOR NEGRO, EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	60.00	PZA	19/05/2025	28/05/2025	60.00 100.00%	60.00 100.00%	60.00 100.00%
TERR-9	RELLENO COMPACTADO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN PASOS DE HASTA 20 CM CON BAILARINA, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO HASTA 20 METROS DE TIRO EN CARRETILLA, HUMECTADO CON AGUA PARA SU COMPACTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	295.45	M3	19/05/2025	30/05/2025	295.45 100.00%	295.45 100.00%	295.45 100.00%

Armar Proyectos y Construcciones de RL de CV

LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

CALLE SIN NOMBRAR 10-41

SANREPRESENTANTE LEGAL

C.P. 09467

Contacto: 2023 mayo 13

Director
HUILA
Contacto: 2023 mayo 13

ALCALDE
MUNICIPIO DE GUERRERO
Tlaxcala, Tlax.

OPERADO
FISM

Limitación Por Invitación a cuando menos tres personas. Procedimiento No: FIMS2501/03

Licitacion Por Invitacion a cuatro o menos personas por procedimiento NO. 110250063

Nombre de la obra: Demolicion de pavimento de concreto hidraulico, excavacion de zanja, cama de arena para recibir

[illegible]

tubería, suministro y colocación de tubería de agua potable, conexión de tomas domiciliarias, retrete y cañerías.

pavimentación de concreto hidráulico presentando deterioro

Ubicación: Calle Xicotencatl entre Avenida Obregón y 10 de suarez

Localidad: Amaxac de Guerrero

Municipio: Amaxac de Guerrero, Tlaxcala

Meta Programada: 578.00 ml

Fecha Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025

Fecha de Termino de los Trabajos: 09 de junio de 2023

Plazo de Ejecucion: 28 Dias Naturales.

ANEXO DT. 44 PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
APOT-030	SUMINISTRO Y CONEXION DE VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO DE 2 1/2", INCLUYE: EXTREMIDADES BRIDADAS DE ESPIGA Y CAMPANA EN PVC, EMPAQUES DE NEOPRENO, TORNILLOS, VOLANTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00	PZA	30/05/2025	30/05/2025		1.00 100.00%		1.00 100.00%
APOT-100	ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F' C= 150 KG/CM2 , DE 0.30 X 0.30 X 0.40 M, PARA TUBO DE 102 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	1.00	PZA	26/05/2025	26/05/2025		1.00 100.00%		1.00 100.00%
APOT-101	ATRAQUE DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL F' C= 150 KG/CM2 , DE 0.20 X 0.20 X 0.40 M, PARA TUBO DE 152 MM DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPOS NECESARIOS	1.00	PZA	26/05/2025	26/05/2025		1.00 100.00%		1.00 100.00%
APOT-026	REGISTRO HIDRAULICO DE 1.00 X1.00 M Y HASTA 1.50 CM DE PROFUNDIDAD, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, MARCO DOBLE Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO 50X50 INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO, CAMA DE GRAVA DE 6 CM DE ESPESOR EN EL FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	1.00	PZA	30/05/2025	31/05/2025		1.00 100.00%		1.00 100.00%

09/06/2025

09-05-2025

12

100

7

LIC CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

~~ARMAR PROYECTOS Y CORTAR LOS CORTES~~

REPRESENTANTE LEGAL

REFRESENABLE LEGAL

CALL SIN KIC 010-10-10 41-5000

SANTA FLORA

1899

Cargo: 2022ormc - 2022-2023

(

9

2

5

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

Licitación Por Invitación a cuando menos tres personas: Procedimiento No: FIMS2501/03

Nombre de la obra: Construcción de Red de Distribución y Red de Alimentación de Agua Potable en Calle Xicohtencatl.

Descripción de la obra: Demolicion de pavimento de concreto hidraulico, excavacion de zanja, cama de arena para recibir tuberia, suministro y colocacion de tuberia de agua potable, conexion de tomas domiciliarias, relleno y compactacion de zanja, pavimentacion de concreto hidraulico previamente demolido.

Ubicación: Calle Xicohtencatl entre Alvaro Obregon y Pino Suarez

Localidad: Amatepec de Guerrero

Municipio: Amatepec de Guerrero, Tlaxcala.

Meta Programada: 57890 ml

Fecha de Inicio de los Trabajos: 13 de mayo de 2025

Fecha de Término de los Trabajos: 09 de junio de 2025

Plazo de Ejecución: 28 Días Naturales.

ANEXO PT-11 PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha de inicio	Fecha de término	01-may.-2025	16-may.-2025	01-jun.-2025	Total
CARR-015	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA RR-2K EN RAZON DE 1.5 LTS/M2, APLICADO MANUAL, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	8.51	M2	29/05/2025	29/05/2025	8.51 100.00%	8.51 100.00%	8.51 100.00%	8.51 100.00%
CARR-2-1	CARPETA DE MEZCLA ASFALTICA TEMPLADACON AGREGADO DE 19 MM (3/4") DE DIAMETRO, DE 6.00 CM DE ESPESOR, TENDIDO MANUAL Y COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO P.U.O.T.	8.51	M2	29/05/2025	29/05/2025	8.51 100.00%	8.51 100.00%	8.51 100.00%	8.51 100.00%
PAV-2.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE MR 30 PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO RAYADO O ESCOBILLADO, JUNTAS FRIAS CON DISCO DE CORTE A CADA 3 METROS, RAYADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 6-6, ANTISOL BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	589.65	M2	30/05/2025	09/06/2025	110.55 18.75%	479.10 81.25%	589.65 100.00%	589.65 100.00%

Porcentaje parcial:
Porcentaje acumulado:

2.83%
2.83%

67.06%
69.89%

30.11%
100.00%

LIC. CARLOS MANUEL DIAZ HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL

CAJUE SIN MONEDA 2025-10-41

Correo: 2025armah@armah.com

OPERADO
FISM

Dircción
HUILOA
Contacto: 2025

551.759.4352



**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ASIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO
PIE2501/003**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: ASIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO**

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
PRESENTE:

Con objeto de ejercer la Inversión autorizada en el marco del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025** del ejercicio fiscal 2025 y con fundamento en la ley de obras públicas para el estado de Tlaxcala y sus municipios. Por este conducto solicito a Usted coordinarse con el Ing. Rolando Pérez Oropeza, quien fungirá como Residente de esta Dirección de Obras Públicas para iniciar los trámites correspondientes a la firma del contrato y demás tramites a que haya lugar para el inicio y durante el proceso de ejecución de obra.

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL	
DESCRIPCION:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.	
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO	CONTRATO N°.: PIE2501/003-01
CALLE:	XICOHTENCATL	
ENTRE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ	
META PROGRAMADA:	\$ 1,068.848.56 (UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)	
PERIODO DE EJECUCION	INICIO:13/05/2025	TERMINO:09/06/2025

EMPRESA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$ 921,421.17	\$ 147,427.39	\$ 1,068,848.56

OPERADO FISM

IMPORTE TOTAL:

(UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N.)

ATENTAMENTE
AMAXAC DE GUERRERO 13 DE MAYO DE 2025

ING. ROLANDO PÉREZ OROPEZA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027





Amamaxac
GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027



**INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ASIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO
FISM2501/003-01**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: ASIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO**

ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.
PRESENTE:

Con objeto de ejercer la Inversión autorizada en el marco del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025** del ejercicio fiscal 2025 y con fundamento en la ley de obras públicas para el estado de Tlaxcala y sus municipios. Por este conducto solicito a Usted coordinarse con la Arq. Carolina Vázquez Correa, quien fungirá como Residente de esta Dirección de Obras Públicas para iniciar los trámites correspondientes a la firma del contrato y demás tramites a que haya lugar para el inicio y durante el proceso de ejecución de obra.

OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHTENCATL	
DESCRIPCION:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.	
LOCALIDAD:	AMAXAC DE GUERRERO	CONTRATO No.: FISM2501/003-01
CALLE:	XICHTENCATL	
ENTRE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ	
META PROGRAMADA:	\$ 1,098.234.00 (UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)	
PERIODO DE EJECUCION	INICIO:13/05/2025	TERMINO:09/06/2025

EMPRESA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	\$ 946,753.45	\$ 151,480.55	\$ 1,098,234.00

IMPORTE TOTAL:

(UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

ATENTAMENTE
AMAXAC DE GUERRERO A 13-DE MAYO DE 2025

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FISM

GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO. TLAX. 2024-2027



Santa Anita Huiloac, Apizaco; a 13 de mayo de 2025.

AT N.: Supervisión de Obra.

Asunto: Inicio de Obra.

C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

El que suscribe **Carlos Manuel Díaz Hernández**, en mi carácter de representante legal de la empresa ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., me dirijo ante usted para informarle que con fecha **13 de mayo de 2025** se da por iniciada la obra:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO: FISM 2501/003

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLE:	XICOHTENCATL
ENTRE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA:	578.00 ml

Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente me despido de usted enviándole un cordial y afectuosos saludos.

ATENTAMENTE

Carlos Manuel Díaz Hernández
Representante Legal

armah
ARMAH Proyectos y Construcción
S. de R.L. de C.V.
RFC: APC16111S8
Calle Sin Nombre 109-10 4ta Secc.
Santa Anita Huiloac, Apizaco
C.P. 90407
2022armah@gmail.com

**OPERADO
FISM**

Santa Anita Huiloac, Apizaco; a 13 de mayo de 2025.

Asunto: Renuncia al Anticipo.

C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

El que suscribe **Carlos Manuel Díaz Hernández**, en mi carácter de **Representante Legal**, de la empresa **ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.**, se dirige de la manera más atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle le informo que **se renuncia al anticipo**, en relación al:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO: FISM 2501/003	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLE:	XICHTENCATL
ENTRE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA:	578.00 ml

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Carlos Manuel Díaz Hernández
Representante Legal

armah
ARMAH Proyectos y Construcción
S. de R.L. de CV
RFC: APC161111S8
Calle sin nombre 109-10 4ta Secc.
Santa Anita Huiloac, Apizaco
C.P. 90407
2022armah@gmail.com





MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DIA	MES	AÑO	ORDEN DE PAGO
11	JUNIO	2025	FISM2501/003

CP. ESTEFANNY PATRICIA TIZAPANTZI GRANDE
TESORERA MUNICIPAL

ORDEN DE PAGO

SIRVASE EFECTUAR EL CHEQUE CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA:
ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

MISMA QUE AMPARA LA FACTURA NUMERO

CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA: **FONDO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025**

IMPORTE A PAGAR:

\$ 513,798.78

POR CONCEPTO DE:

PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. ---- ESTIMACION 1 (UNO)

DATOS DE LA OBRA PUBLICA

NOMBRE

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL

UBICACIÓN

XICOHTENCATL

PROGRAMA

FISM 2025

RAMO

XXXIII

NUMERO DE EXPTE.

FISM2501/003

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION

AVANCE FISICO

47.00%

MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

COSTO TOTAL DE LA OBRA

\$ 1,098,234.00

CONCEPTO	N. FACTURA	DEDUCCION	IMPORTE A PAGAR	MONTO EJERCIDO
ESTIMACION 01 (UNO)	28abff9a-e988-41cb-bbaa-994362c68304	2,452.19	513,798.78	516,250.97

SALDO POR EJERCER

\$ 581,983.03

IMPORTE POR PAGAR:

581,983.03

REFERENTE A LO DESGLOSADO EN CUADRO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE HE LLEVADO ACABO LA REVISION FISICA Y DOCUMENTAL, SIN QUE EXISTA NINGUN INCONVENIENTE EN LIQUIDAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE, ASI MISMO LE MANIFIESTO QUE SE HA LLEVADO A CABO LA SUPERVISION DE ESTA OBRA POR EL PERSONAL DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, Y SE HA CONSTATADO QUE LOS MATERIALES, SUMINISTROS E IMPLEMENTOS Y DEMAS UTILIZADOS EN LA MISMA, CORRESPONDEN A LOS AUTORIZADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA MISMA OBRA CONTRATADA, POR LO QUE SE RATIFICA QUE EL IMPORTE QUE AMPARA ESTA ORDEN DE PAGO REPRESENTA EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO REAL DE LA MISMA, POR LO QUE NO EXISTE NINGUN INCONVENIENTE EN LIQUIDAR EL CITADO DOCUMENTO

PARA LO ANTERIOR MANIFESTADO, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICA ESTA COMPLETO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCION Y EL PAGO CORRESPONDIENTE, TAL Y COMO LO MARCAN LAS LEYES Y NORMATIVIDADES APLICABLES VIGENTES A ESTE PROGRAMA, ASI COMO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE COORDINACION FISCAL, ADEMAS, TODO ESTO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 74 Y 74 BIS DE LA LEY MUNICIPAL DEL ESTADO DE TLAXCALA, ASI COMO DE LA AUTORIZACION PLENA Y EXPEDITA DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, Y DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMAXAC

ELABORO:

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
SUPERVISORA DE OBRA PUBLICA

REVISO:

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

VO. BO.

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

OPERADO FISM

Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, 13 de mayo de 2025.

Asunto: **Escrito de designación del
Director Responsable de Obra.**

C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO: FISM 2501/003

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLE:	XICOHTENCATL
ENTRE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA:	578.00 ml

El que suscribe **Carlos Manuel Díaz Hernández**, en mi carácter de **Representante Legal**, de la empresa ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., y en relación a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera más atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que el **Arq. Miguel Benitez Rivera (SI-DRO-00033)**, será el **director responsable de obra a cargo**, cuyos datos en listo a continuación:

	Director responsable de obra
Nombre	Miguel Benitez Rivera
No. de Cedula Profesional	2840661
Domicilio Fiscal	Santa Cruz Techachalco, Panotla, Tlaxcala. C.P. 90145
Teléfono	246-463-73-63
Correo electrónico	miguelbenitez332@gmail.com

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA, 2022-2027

ATENTAMENTE

armah

ARMAH Proyectos y Construcción
S. de RL de CV

RFC: APC161111S8

Calle sin nombre 109-10 4ta Secc.
Santa Anita Huiloac, Apizaco

C.P. 90407

2022armah@gmail.com

Carlos Manuel Díaz Hernández
Representante Legal

**OPERADO
FISM**

TESORERIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA, 2022-2027

Santa Anita Huiloac, Apizaco; a 13 de mayo de 2025.

Asunto: **Carta de aceptación del
Director Responsable de Obra.**

C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

En atención **Carlos Manuel Díaz Hernández**, en mi carácter de **Representante Legal**,
de la empresa ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L DE CV,

El que suscribe el **Arq. Miguel Benitez Rivera (SI-DRO-00033)**, se dirige de la manera
más atenta y respetuosa a su muy digno cargo para comunicarle **mi aceptación al cargo
de Director Responsable de Obra**, conforme a lo señalado en el **artículo 42 de la Ley de
Construcción del Estado de Tlaxcala**, así como dar seguimiento técnico necesario
durante la ejecución del mismo; en referencia a la obra que se anuncia a continuación:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO: FISM 2501/003

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLE:	XICOHTENCATL
ENTRE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA:	578.00 ml

**Anexo al presente escrito copia de mi Licencia de Director Responsable de Obra y
Cédula Profesional.**

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Carlos Manuel Díaz Hernández
Representante Legal

armah
ARMAH Proyectos y Construcción
S. de RL de CV
RFC: APC16111S8
Calle sin nombre 109-10 4ta Secc.
Santa Anita Huiloac, Apizaco
C.P. 90407
2022armah@gmail.com

Asunto: CARTA DE ACEPTACIÓN D.R.O.

Tlaxcala, Tlax. A 9 de mayo de 2025.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este conducto, manifiesto mi **ACEPTACIÓN** para fungir como **DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA** para la empresa **ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. A. DE C. V.**, en caso de que le sea asignada para su ejecución la obra **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHTENCATL** en el Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala.



REGISTRO DE DIRECTOR RESPONSABLE
CORRESPONSABLE DE OBRA
COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL

TLAXCALA



TIPO DE REGISTRO: DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
NOMBRE: MIGUEL BENITEZ RIVERA
PROFESION: ARQUITECTO
CEDULA PROFESIONAL: 2840601
REGISTRO: SI-DRO- 00033

EXPEDIDA: 2025-03-18 VENCIMIENTO: 2025-12-31

USO EXCLUSIVO ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION

**S. A. DE C. V. PARA PROCEDIMIENTO DE
ORDEN DE PAGO: SF-6680449
ADJUDICACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION
DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHTENCATL",**

**AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA**

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de firma digital de funcionario competente. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <https://validador.ceropal.mx/>, para lo cual será necesario capturar el UUID asentado al margen izquierdo del documento que desea verificar.
De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR visible en el registro de consentimiento.



ARQ. DIEGO CORONA CREMEAN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PRESIDENCIA
DE LA COMISION DE ASISTENCIA TECNICA INSTITUCIONAL

EN CASO DE IRREGULARIDADES EN EL DESEMPEÑO DEL TITULAR DE ESTE REGISTRO,
FAVOR DE NOTIFICAR A LA SI.



armah

Armah Proyectos y Construcción S. de RL de CV
RFC: APC161711587
CALLE SIN NOMBRE 109-10 400, SECCION 1
SANTA ANITA HUILOAC, APC
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com

**OPERADO
FISM**

TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

1800

CÉDULA 2840661

TÍTULO REGISTRADO A FOJAS 014-12

DEL LIBRO A284

DE RE PROFESIONALES Y

GRA



S. E. P.

ON DENOMINACIÓN DE PROFESIÓN


ATAMIENTO DE REGISTRO

EDICIÓN DE CÉDULAS

B. J. J.

FIRMA DEL INTERESADO


AMAH
PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAHAC DE GSB. TIAH 2022. 015


AMAH
TESORERÍA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
AMAHAC DE GSB. TIAH

amah

Amah Proyectos y Construcción S. de RL de CV
RFC: APC161711189
CALLE SIN NOMBRE 109-10-011 SECTOR
SANTA ANITA HUILA, AP. 1
C.P. 90400
Correo: 2022amah@gmail.com

OPERADO
FISM

1801

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

2840661


EN VIRTUD DE QUE MIGUEL BENITEZ
RIVERA

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE PROFESIONES Y SU REGLAMENTO SE LE EXPIDE LA PRESENTE

CÉDULA

CON EFECTOS DE PATENTE
PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE
ARQUITECTO


MEXICO, D.F. A 12 DE ABR DE 1999


DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

LIC. DIANA CECILIA ORTEGA AMIEVA



ARMAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ARMAR DE GRS. YIA



ARMAR
PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ARMAR DE GRS. YIA

armah

Armah Proyectos y Construcción S. de RL
RFC: APC1211158

CALLE SIN NOMBRE 10-10 4TA SECT
SANTA ANITA HUICLOAC, A-
C.P. 93407

Correo: 2022armar@gmail.com

**OPERADO
FISM**



Santa Anita Huiloac, Apizaco; a 13 de mayo de 2025.

Asunto: **Escrito de designación del superintendente Obra.**

C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO: FISM 2501/003

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICHTENCATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLE:	XICHTENCATL
ENTRE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA:	578.00 ml

El que suscribe **Carlos Manuel Díaz Hernández**, en mi carácter de **Representante Legal**, de la empresa ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V., y en relación a los datos asentados en la tabla anterior, me dirijo de la manera más atenta y respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle que el **Ing. Horacio Moreno Juárez, será el superintendente de la obra a cargo**, así como, persona autorizada para firma de bitácora (electrónica y/o convencional), cuyos datos enlisto a continuación:

	Superintendente de obra
Nombre	Horacio Moreno Juárez
No. de Cedula Profesional	10421348
Domicilio Fiscal	C. Fco. Villa Sur No. 15A
Teléfono	246-109-97-44
Correo electrónico	horaciomorenoj@hotmail.com

De igual modo lo faculto para que en su representación pueda oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carácter personal, así como tomar las decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarte un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Carlos Manuel Díaz Hernández
Representante Legal

armah
ARMAH Proyectos y Construcción
S. de R.L. de C.V.

RFC: APC16111S8

Calle sin nombre 109-10 4ta Secc.
Santa Anita Huiloac, Apizaco
C.P. 90407

2022armah@gmail.com





Santa Anita Huiloac, Apizaco; a 13 de mayo de 2025.

Asunto: **Carta de aceptación del
superintendente Obra.**

C. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO.
P R E S E N T E.

En atención **Carlos Manuel Díaz Hernández**, en mi carácter de **Representante Legal**,
de la empresa ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.

El que suscribe el **Ing. Horacio Moreno Juárez**, se dirige de la manera más atenta y
respetuosa a su muy digno cargo, para comunicarle **mi aceptación al cargo de**
Superintendente de Obra, con las responsabilidades y atribuciones que ellos implique,
en referencia a la obra que se anuncia a continuación:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO: FISM 2501/003

NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOHTECATL
CONSISTENTE EN:	PRELIMINARES, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
CALLE:	XICOHTECATL
ENTRE:	ÁLVARO OBREGÓN Y PINO SUAREZ
MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
META PROGRAMADA:	578.00 ml

**Anexo al presente escrito copia de mi Cédula Profesional, constancia de situación
fiscal y credencial de elector.**

Sin otro particular por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.


ATENTAMENTE

Ing. Horacio Moreno Juárez
Superintendente de Obra

armah
ARMAH Proyectos y Construcción
S. de RL de CV
RFC: APC161111S8
Calle sin nombre 109-10 4ta Secc.
Santa Anita Huiloac, Apizaco
C.P. 90407
2022armah@gmail.com

**OPERADO
FISM**

TESORERÍA AMAXAC
RENTAMIENTO CONSTRUCCIONES
AMAXAC DE GUERRERO

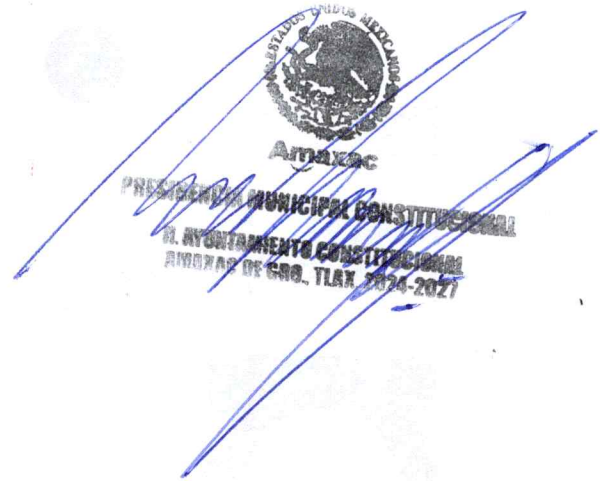

armah

Armar Proyectos y Construcción S. de RL de CV
RFC: APC161111S8

CALLE SIN NOMBRE 109-10 4TA SECCION
SANTA ANITA HUILOAC, APO
C.P. 90407
Correo: 2022armah@gmail.com

OPERADO
FISM

